168

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

Chota, 06 de septiembre del 2021.

CARTA N°020 – 2021/RRV/RL/CSE

Sr. : ***ING. MARTIN VASQUEZ RUBIO***
Gerente Sub Regional.

Atención : **Ing. CARLOS Y. BURGA TARRILLO.**
Sub Gerencia de Operaciones.

Asunto : **ALCANZAR VALORIZACION N°03 - MES DE AGOSTO 2021 DE LA SUPERVISIÓN**

Referencia : **CONTRATO N° 013-2021-GSRCHOTA. (Supervisión)**

Proyecto : **"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"**

De nuestra consideración.

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez hacer llegar adjunto a la presente el informe de la SUPERVISISON de la obra en referencia, correspondiente a la Valorización N°03 del mes de agosto del 2021, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2021.

Se solicita el pago de acuerdo al siguiente cuadro:

1)	MONTO SUPERVISION SIN IGV		**295,481.00**
2)	PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		**31.00**
3)	MONTO A PAGAR		**38,166.30**
4)	IGV		**6,869.93**
5)	**MONTO A PAGAR A LA SUPERVISION**		**45,036.23**
TOTAL		**S/.**	**45,036.23**

Para el pago, tener en consideración el descuento del 10.00 %, por concepto de retención de Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Se Adjunta informe de la Supervisión

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

INFORME Nº 019-2021-HLS/JS

Sr. : SR. ROYMER RIVERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN LEGAL CONSORCIO EDEN

Asunto : PRESENTACION DE LA VALORIZACIÓN Nº03 DE LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Referencia : CONTRATO N°013-2021-GSRCH (DE LA SUPERVISION)
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"

Fecha : 06 de septiembre del 2021

De mi especial consideración:

De mi especial consideración:

Por la presente se alcanza el Informe de la Valorización N° 03 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2021, presentado por la **SUPERVISION** de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA".

Se recomienda su trámite correspondiente.

Se adjunta informe de la Supervisión.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
CIP 54174
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

INFORME N° 019 -2021-HLS/JS

SOBRE LA VALORIZACION DE OBRA Nº 03 – AGOSTO 2021 DE LA SUPERVISION

INDICE

a) ASPECTO GENERALES DE LA OBRA
b) HECHOS RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
c) RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA
d) RESUMEN DE VALORIZACIONES, ADELANTOS Y AMORTIZACIONES: DEDUCCIONES Y REDUCCIONES
e) RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL EJECUTOR DE OBRA
f) ANALIS COMPARTIVO AVANCES-CURVA S
g) RESUMEN DE PERSONAL, MAQUINARIA DE LA CONTRATISTA Y SUPERVISION
h) JORNALES GENERADOS
i) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
j) PANEL FOTOGRAFICO
k) COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
l) VALORIZACION DEL MES DE INFORME
m) CONTROL ECONOMICO FORMATO E-4
n) INFORMES DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE
o) COPIA DE R.H., BOLETAS, FACTURA QUE EVIDENCIE EL PAGO AL PROFESIONAL
p) CERTIFICADOS DE HABILIDAD
q) ANEXOS
r) CD

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

a.) GENERALIDADES

a.1) DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.OBRA	: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA DE HUALGAYOC Y CELENDIN
2. UBICACIÓN	LOCALIDADES : SANTA ROSA – OXAPAMPA. DISTRITOS : BAMBAMARCA – LIBERTA DE PALLAN PROVINCIAS : HUALGAYOC – CELENDIN REGIÓN : CAJAMARCA
3. PROCESOS DE SELECCIÓN OBRA	: LICITACION PUBLICA N° 004-2020-GSRCH – Primera Convocatoria.
4. ENTIDAD EJECUTORA	: GOBIERNO SUB REGIONAL CHOTA
5. SISTEMA DE CONTRATACION	: PRECIOS UNITARIOS
6. VALOR REFERENCIAL C/IGV	: S/. 11'602.126.10 soles (a octubre 2020)
7. CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	: CONSORCIO VIAL SAN JUAN
8. REPRESENTANTE LEGAL	: HENRY LENIN MEDINA BRIONES
9. RESIDENTE DE OBRA	: ROBERTO CARLOS TINACO ZARATE
10. CONTRATO DE OBRA	: 011-2021-GSRCHOTA
11. FECHA SUSCRIP. DE CONTRATO EJEC. OBRA	: 07 ABRIL 2021
12. MONTO CONTRATADO - EJECUCIÓN OBRA	: S/. 10'441,913.49 soles
13. PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL PROYECTO	: 240 DIAS CALENDARIO
14. INICIO DE OBRA	: 01 DE JUNIO DEL 2021
15. TERMINO PLAZO DE LA OBRA	: 26 DE ENERO DEL 2021

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 56134

SUPERVISION

1. CONSULTOR DE LA SUPERVISION	: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
2. REPRESENTANTE LEGAL	: ROYMER RIVERA VASQUEZ
3. JEFE SUPERVISION	: Ing. HECTOR LOZANO SALDAÑA
4. CONTRATO DE SUPERVISION	: 013-2021- GSRCHOTA
5. FECHA DE CONTRATO DE SUPERVISION	: 06 DE MAYO 2021
6. MONTO DEL CONTRATO	: S/. 354,667.59 soles
7. PLAZO DE EJUCUCION	: 240 DIASCALENDARIO

a.2 LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA DE HUALGAYOC Y CELENDIN-CAJAMARCA"

Departamento/Región	:	Cajamarca
Provincias	:	Hualgayoc –Celendín
Distritos	:	Bambamarca – Libertad de Pallán
Localidades	:	Santa Rosa - Oxapampa
Región Geográfica	:	Sierra

a.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 240 días calendarios.

b) HECHOS RELEVANTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

No se ha presentado algún hecho relevante o ha sido necesario aplicar alguna medida correctiva con respecto a trabajos realizados en el mes correspondiente a la valorización N°03.

c) RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA

DE LA VALORIZACIÓN N°03 DEL 01 – AL 31 DE AGOSTO 2021 DEL CONTRATISTA

AVANCES FÍSICOS

Avance periodo del 01 al 31 agosto del 2021

Avance programado del 01 al 31 de agosto	: 17.70 %
Avance ejecutado del 01 al 31 de agosto	: 11.20 %
Avance programado acumulado al 31 de agosto 2021	: 30.83 %
Avance ejecutado acumulado al 31 de agosto 2021	: 24.96 %

Situación de la obra: Atrasada en 5.87 % (respecto al avance acumulado programado).

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra atrasada en un 5.87 % (RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO).

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES			
Resumen de Valorizaciones			
	Valorización N° 01	**Valorización N° 02**	**Valorización N° 03**
COSTO DIRECTO	**S/. 183,817.29**	**S/. 874,951.28**	**S/. 862,117.45**
GASTOS GENERALES 10.00 %	S/. 18,381.73	S/. 87,495.13	S/. 86,211.75
UTILIDAD 5.00 %	S/. 9,190.86	S/. 43,747.56	S/. 43,105.87
SUB - TOTAL	**S/. 211,389.89**	**S/. 1,006,193.97**	**S/. 991,435.07**
I.G.V. (18 %)	S/. 38,050.18	S/. 181,114.91	S/. 178,458.31
TOTAL	**S/. 249,440.07**	**S/. 1,187,308.88**	**S/. 1,169,893.38**
PORCENTAJE	**2.39%**	**11.37%**	**11.20%**

RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA					
N°	PERIODO	PARCIAL S/.	%	ACUMULADO S/.	%
VALORIZACION 01	jun-21	249,440.07	2.39%	249,440.07	2.39%
VALORIZACION 02	jul-21	1,187,308.88	11.37%	1,436,748.95	13.76%
VALORIZACION 03	Ago-21	1,169,893.38	11.20%	2,606,642.33	24.96%
TOTAL				2,606,642.33	24.96%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54124

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

d) RESUMEN DE VALORIZACIONES, ADELANTOS, AMORTIZACIONES DEDUCCIONES Y REDUCCIONES, RERAJUSTES PAGOS EFECTUADOS A LA CONTRATISTA

RESUMEN DE VALORIZACIONES

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

(Del 01/08/2021 al 31/08/2021)

HOJA DE RESUMEN

Obra : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
Contratista : CONSORCIO VIAL SAN JUAN
Supervisor : CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO	VALORIZACIONES			
			ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO
1)	VALORIZACION CONTRACTUAL	8,849,079.23	1,217,583.86	991,435.07	2,209,018.93	6,640,060.30
2)	REINTEGROS		0.00	0.00	0.00	
	Fórmula Polinómica Unica		0.00	0.00	0.00	
3)	VALORIZACION BRUTA (1) + (2)	8,849,079.23	1,217,583.86	991,435.07	2,209,018.93	6,640,060.30
4)	AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES Y OTROS		182,637.57	360,465.33	543,102.90	2,822,954.93
	AMORTIZACIONES		182,637.57	360,465.33	543,102.90	2,822,954.93
	Adelanto Directo		182,637.57	148,715.26	331,352.83	1,144,724.31
	Adelanto Materiales N° 01		0.00	211,750.07	211,750.07	1,678,230.62
	DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	Adelanto Directo 1		0.00	0.00	0.00	0.00
	Adelanto Materiales N° 01		0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
5)	VALORIZACION NETA (3) - (4)	8,849,079.23	1,034,946.29	630,969.74	1,665,916.03	7,183,163.20
6)	IGV (18 % DE (3) - (4))	1,592,834.26	186,290.33	113,574.55	299,864.88	1,292,969.38
7)	MONTO A TOTAL A CANCELAR (5) + (6)	10,441,913.49	1,221,236.62	744,544.29	1,965,780.91	8,476,132.58

AVANCE COMPARATIVO GENERAL

AVANCE DE OBRA	EJECUTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	11.20%	ACUM EJECUTADO	24.96%
	PROGRAMADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	17.70%	ACUM PROGRAMADO	30.83%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

RESUMEN DE VALORIZACIONES				
VALORIZACION	MONTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO
V - 01	249,440.07	10,441,913.42	2.39%	2.39%
V - 02	1,187,308.88		11.37%	13.76%
V - 03	1,169,893.38		11.20%	24.96%
TOTAL	**2,606,642.33**			**24.96%**

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

Se ha efectuado el Adelanto Directo por un monto de S/. 1,566,287.02 soles, con garantía de Fideicomiso.

ADELANTO MATERIALES

Se ha efectuado el adelanto de materiales a la Contratista por un monto de S/. 2,230,177.21 (21.36% del monto contratado), mes de agosto del 2021, con garantía de Fideicomiso.

AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

Se tiene el siguiente cuadro de amortizaciones.

CONTROL DEL ADELANTO DIRECTO	
MONTO CONTRATADO	S/. 10,441,913.49
MONTO VALORIZADO DEL MES	S/. 1,169,893.38
ADELANTO EN EFECTIVO OTORGADO (SIN IGV)	S/. 1,327,361.88
ADELANTO EN EFECTIVO OTORGADO (CON IGV)	S/. 1,566,287.02
SALDO POR AMORTIZAR	S/. 1,175,290.68

VALORIZACION	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO CON IGV	AMORTIZACION ACUMULADA
VAL 01	37,416.01	37,416.01
VAL 02	178,096.32	215,512.33
VAL 03	175,484.01	390,996.34
TOTAL		**390,996.34**

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

En la presente valorización se ha realizado la amortización de Adelanto de Materiales, correspondiente al mes de agosto 2021

CONTROL DEL ADELANTO DE MATERIALES	AGOSTO
MONTO CONTRATADO	S/. 10,441,913.49
MONTO VALORIZADO DEL MES	S/. 1,169,893.38
ADELANTO DE MATERIALES (21.36%) SIN IGV	S/. 1,889,980.69
ADELANTO DE MATERIALES EN EFECTIVO OTORGADO (21.36%) CON IGV	S/. 2,230,177.21
AMORTIZACION =VB*21.36% (CON IGV)	**S/. 249,865.081**
SALDO POR AMORTIZAR (CON IGV)	**S/. 1,980,312.13**

REAJUSTES

Se presenta el siguiente cuadro de Reajustes por Fórmula Polinómica.

VAL	K-1	REAJUSTES				
		PROGRAMADO		EJECUTADO		RECONOCIDO
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	
1	0.058	12,839.92	12,839.92	12,303.74	12,303.74	12,303.74
2	0.087	81,894.00	94,733.92	87,515.02	99,818.76	87,515.02
3	0.1	152,680.96	247,414.88	96,622.29	196,441.05	96,622.29

En la presente valorización se tiene la cantidad de S/. 196,441.05 soles, sin considerar los deductivos que no pertenecen.

RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION

CUADRO RESUMEN DE RETENCIONES Y GARANTIAS DE SUPERVISON DE OBRA						
VALORIZACION Nº	FACTURA Nº	MONTO VALORIZADO	I.G.V.	RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	DETRACCION SUNAT	NETO PAGADO
		TOTAL	18%	10% TOTAL CONTRATO	12%	
01 (Jun-21)		43,583.45	S/. 7,845.02	8,866.69	5,230.01	
02 (Jul-21		45,036.23	S/. 6,504.53	7,267.36	5,404.35	
03 (Ago-21)		45,036.23	S/. 6,504.53	7,267.36	5,404.35	
TOTALES		S/. 133,655.91	S/. 20,854.08	S/. 23,401.41	S/. 16,038.71	S/. 0.00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

e) RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA CONTRATISTA (METRADOS DEL MES)

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO ACTUAL
	MEJ CV TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA		
01	**OBRAS PRELIMINARES**		
01.01	CARTEL DE OBRA 2.40x4.80m.	und	-
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	-
01.03	CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA	GLB	-
01.04	TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS	KM	14.56
02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	67,243.96
02.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	3,454.20
02.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	1,527.47
02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXPLANACIONES	m3	86,670.75
02.06	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MAETRIAL EXCEDENTE	m3	86,670.75
03	**PAVIMENTOS**		
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	3,878.40
10	**CUNETAS SIN REVESTIR**		
10.01	CONFORMACIÓN DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO	m	-
10.02	CONFORMACIÓN DE CUNETA EN ROCA SUELTA	m	-
12	**IMPACTO AMBIENTAL**		
12.01	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	GLB	0.13
12.02	PROGRAMA DE REVEGETACION	GLB	-
12.03	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	und	-
14	**VARIOS**		
14.01	REPOSICION DE TUBERIA PVC AGUA S.P. CLASE 10 Ø 1"	m	-
14.03	FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES	GLB	0.13
15	**SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION**		
15.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	-
15.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	-
15.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	0.13
15.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION.	GLB	0.13
15.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	0.13
15.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO.	GLB	0.13
16	**PLAN DE VIGILANCIA COVID - 19**		
16.01	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19	GLB	0.13
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=13.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25)		
18	**OBRAS PRELIMINARES**		
18.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	149.92
18.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	214.92
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57)		
31	**OBRAS PRELIMINARES**		
31.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	171.67
31.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	246.67
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LAS CHONTAS, L=10.00m (Km 17+574.40 - 17+884.40)		
44	**OBRAS PRELIMINARES**		
44.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	145.50
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PORVENIR, L=10.00m (Km 17+813.50 - 17+823.50)		
57	**OBRAS PRELIMINARES**		
57.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	119.82

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

01.04 TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS

En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras.

02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO

La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y control por el Supervisor.

El trabajo de excavación en material suelto se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil y la sección de la subrasante estén de acuerdo con los planos del proyecto, con éstas especificaciones y las instrucciones del Supervisor. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el Supervisor.

02.02 CORTE EN ROCA SUELTA

La información sobre estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y control por el Supervisor.

HECTOR MOZANO SALDAÑA
Ingeniero Civil
CIP. 54174

El trabajo de excavación en material suelto se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil y la sección de la subrasante

estén de acuerdo con los planos del proyecto, con éstas especificaciones y las instrucciones del Supervisor. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el Supervisor.

02.03 CORTE EN ROCA FIJA

Comprende la excavación de masas de rocas mediana o fuertemente litificadas que, debido a su cementación y consolidación, requieren el empleo sistemático de explosivos. Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual mayor de un metro cúbico (1 m3), procedentes de macizos alterados o de masas transportadas o acumuladas por acción natural, que para su fragmentación requieran el uso de explosivos.

02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXPLANACIONES

Bajo esta partida, El Contratista, efectuará la eliminación de material que excedentes de las zonas de corte de material suelto, roca suelta, roca fija, y también la eliminación de material a consecuencia de derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la plataforma de la carretera, obstaculizando el tráfico. El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el material proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc.

02.06 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

La partida comprende la disposición y acondicionamiento de material excedente en la zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a efectuar el trabajo de manera tal que no disturbe el ambiente natural y más bien se restituyan las condiciones originales, con la finalidad de no introducir impactos ambientales negativos en la zona.

HECTOR [illegible] ALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Se incluyen los trabajos de plantación o reimplante de pastos y/o arbustos, enredaderas, plantas para cobertura de terreno y en general de plantas. Con la finalidad de estabilizar los taludes.

03.01. PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE

Descripción.

Se realizara los trabajos necesarios de modo que la superficie de la Sub - Rasante presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los planos del Proyecto, como en las presentes especificaciones.

Se denomina la Sub - rasante a la capa superior de la explanación que sirve como superficie de sustentación de la capa de afirmado .Su nivel es paralela al de la rasante y se lograra conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto.

La superficie de la Sub - rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto.

12.01. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este ítem consiste en la ejecución de todas las actividades que contiene la presente partida, referida a la educación ambiental.

14.03. FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES

Se refiera al flete a pagarse por el traslado de los materiales desde la ciudad de Bambamarca hasta el lugar de la obra, en la memoria de cálculo se detalla esta partida.

15.03. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

DESCRIPCIÓN

Se define la protección colectiva como aquella que protege simultáneamente a varios trabajadores frente a una situación peligrosa determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la materialización de un accidente, nunca lo previene.

Se consideran los siguientes equipos de protección colectiva:

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

15.04. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Esta especificación es aplicable a los trabajos necesarios para la señalización de las áreas de trabajo durante la construcción.

La señalización durante la construcción consiste en el aislamiento del área de trabajo mediante la colocación de elementos de señalización informativos y preventivos, tales como cinta delimitadora amarilla de 75 mm (Cinta de precaución) y señalizador tubular o delineador tubular o tabique de madera, para cercar y aislar el perímetro en el sitio de la obra, e impedir que se transporte y se disponga tierra, residuos de construcción o cualquier material a las zonas adyacentes a las de trabajo, para garantizar la seguridad de las personas y vehículos que transitan por el lugar.

El Residente debe presentar al Supervisor los planes y esquemas necesarios, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad industrial, incluyendo la señalización en cada una de las actividades del proyecto.

15.05. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCIÓN

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos.

Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben ser removidos en el lugar de trabajo. Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas. Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deberán estar libres de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por deslizamiento. Los cables, conductores eléctricos, mangueras del equipo de oxicorte y similares se deben tender evitando que crucen por áreas de tránsito de vehículos o personas, a fin de evitar daños a estos implementos y/o caídas de personas.

El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles, debe efectuarse cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras.

Los materiales e insumos sobrantes no deben quedar en el área de trabajo, sino ser devueltos al almacén de la obra, Al término de la jornada laboral.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 54176

Los comedores deben mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. Los restos de comida y desperdicios orgánicos deben ser colocados en cilindros con tapa, destinados para tal fin.

Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. Si se tienen pozos sépticos o de percolación se les dará mantenimiento periódico.

15.06. RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO.

DESCRIPCIÓN

La entrada en vigor de la nueva normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales y la modificación de la notificación oficial de los daños sufridos por los trabajadores derivados del trabajo, requieren incorporar algunos cambios en la metodología que sigue nuestro Instituto en la investigación de los accidentes.

Se trata de una herramienta que facilitará la realización de las investigaciones de los accidentes laborales y fomentará que se lleven a cabo con calidad contrastada y criterios uniformes. De esta manera, todos los Técnicos que trabajan en el campo de la prevención de riesgos laborales podrán utilizar conceptos uniformes y variables con idéntica codificación, ofreciendo la posibilidad de explotación técnica y estadística de los datos resultantes de las investigaciones de los accidentes laborales.

16.01. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

Establecer Lineamientos de actuación en la ejecución de obras de construcción para evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que interviene en la ejecución en una obra de construcción y las personas que por cualquier motivo ingresen al área en la que esta se ejecuta.

HECTOR [illegible] SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=13.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25)

18.01. LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS

Descripción

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

Medición y forma de pago: Se computará el área limpiada en M2 y se considera el pago en proporción al metrado total. No se considera ningún adicional para esta partida.

18.02 TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS

Comprende el replanteo del eje del puente, el trazo para las excavaciones en accesos y el establecimiento de las cotas o niveles de referencia para los elementos de la estructura.

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57)

31.01. LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS

Descripción

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Medición y forma de pago: Se computará el área limpiada en M2 y se considera el pago en proporción al metrado total. No se considera ningún adicional para esta partida.

31.02 TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS

Comprende el replanteo del eje del puente, el trazo para las excavaciones en accesos y el establecimiento de las cotas o niveles de referencia para los elementos de la estructura.

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LAS CHONTAS, L=10.00m (Km 17+574.40 - 17+584.40)

44.01. LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS

Descripción

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

Medición y forma de pago: Se computará el área limpiada en M2 y se considera el pago en proporción al metrado total. No se considera ningún adicional para esta partida.

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PORVENIR, L=10.00m (Km 17+813.50 - 17+823.50)

57.01. LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS

Descripción

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el

tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

Medición y forma de pago: Se computará el área limpiada en M2 y se considera el pago en proporción al metrado total. No se considera ningún adicional para esta partida.

f) ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VERSUS AVANCE REAL, FÍSICO Y FINANCIERO, CON SUS CORRESPONDIENTES CURVAS "S"

CUADROS INFORMATIVOS DE AVANCES

AVANCE FISICO PROGRAMADO

VALORIZACION	MONTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO
V - 01	260,310.41	10,441,913.49	2.49%	2.49%
V-02	1,111,052.76	1,371,363.17	10.64%	13.13%
V-03	1,848,646.43	3,220,009.60	17.70%	30.84%
V-04	1,490,481.07		14.27%	45.11%
V-05	1,586,816.68		15.20%	60.31%
V-06	1,349,766.12		12.93%	73.23%
V-07	1,799,986.04		17.24%	90.47%
V-08	994,853.98		9.53%	100.00%
TOTAL			100.00%	

AVANCE VALORIZADO EJECUTADO

VALORIZACION	MONTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO
V - 01	249,440.07	10,441,913.49	2.39%	2.39%
V - 02	1,187,308.88	1,436,748.95	11.37%	13.76%
V - 03	1,169,893.38	2,606,642.33	11.20%	24.96%
TOTAL	2,606,642.33			24.96%

El monto de la Valorización Nº03 correspondiente al mes de agosto del 2021, equivale a S/. 1,169,893.38 Soles (Un millón ciento sesenta y nueve mil ochocientos noventa y tres con 38/100 soles), incluido IGV.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

El avance de obra programado del mes es el 17.70 %, y el avance acumulado ejecutado es de 24.96 % y el programado acumulado que es de 30.83 %, la obra se encuentra atrasada respecto a lo programado.

Se ha solicitado y efectuado el Adelanto Directo por un valor del 15% **(S/. 1,566,287.02)**, el Adelanto de Materiales está en trámite.

Se presenta, el Cuadro de comparación de Avance Físico y Avance Financiero Programado con el Ejecutado.

CURVA "S"

GRAFICO Nº01:PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO Vs. EJECUTADO ACUMULADO

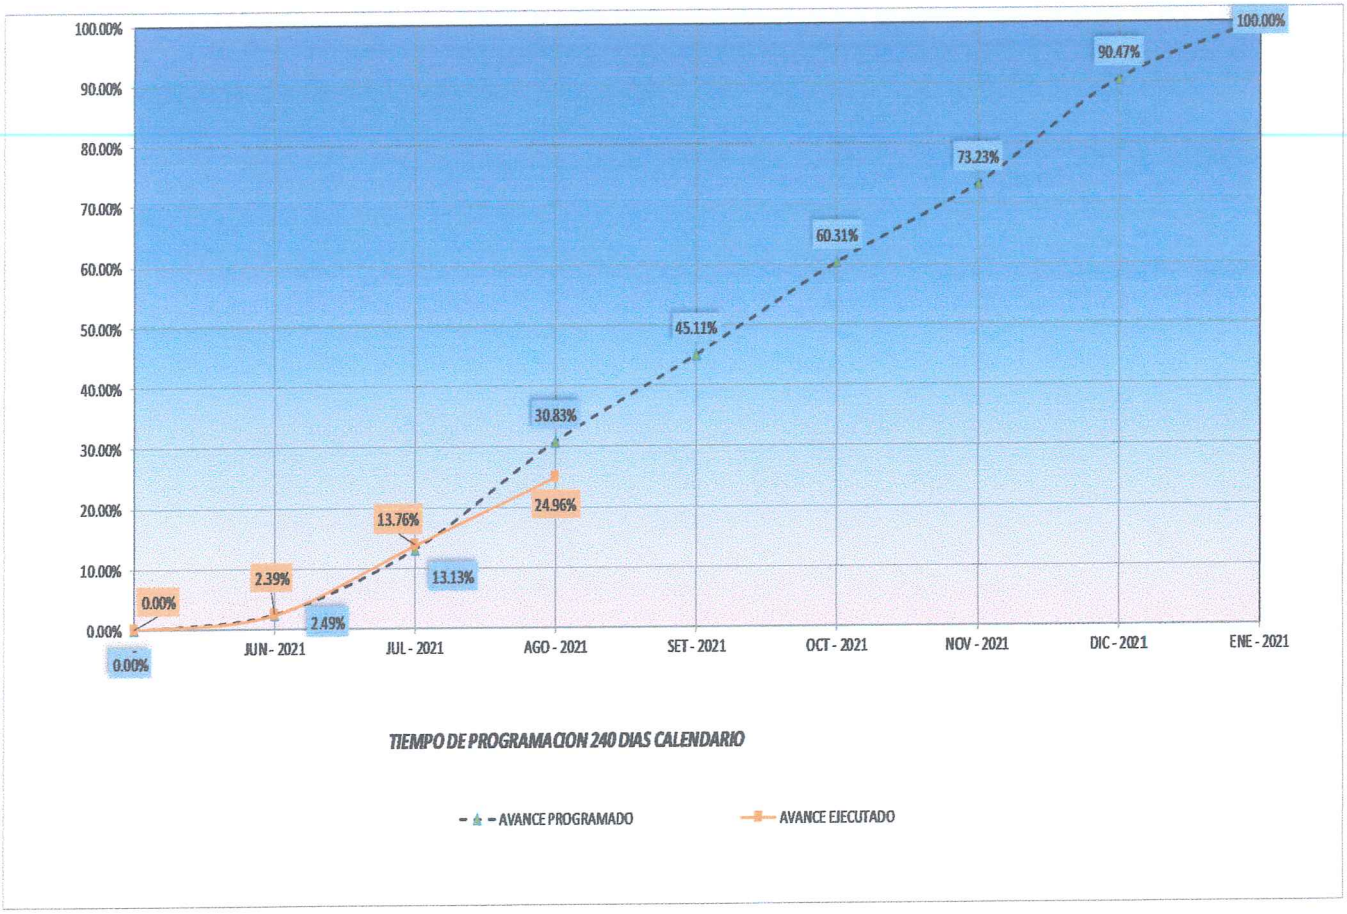

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

GRAFICO Nº02: PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO Vs. EJECUTADO ACUMULADO)

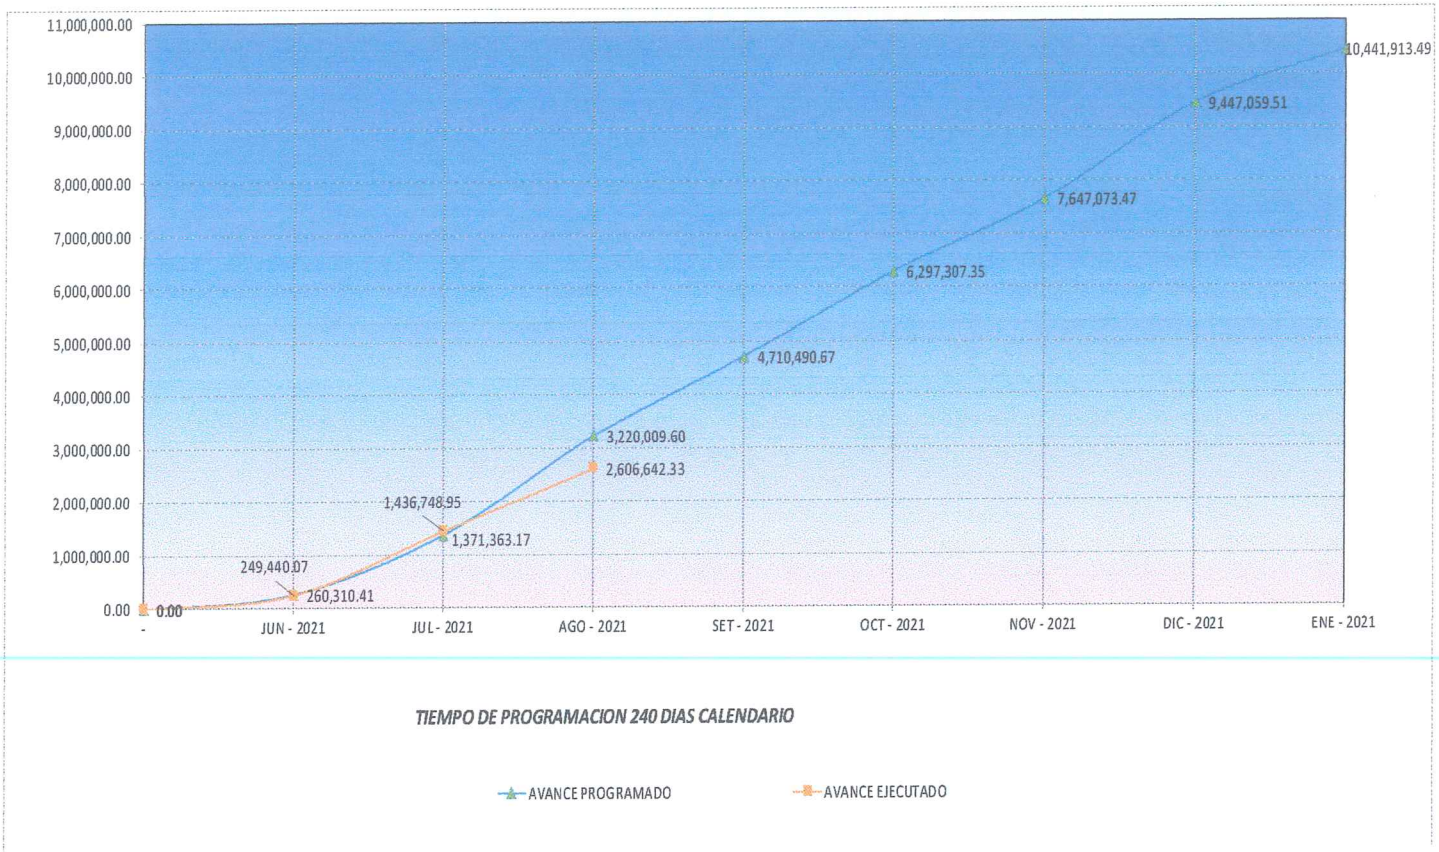

g) RESUMEN DE PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS, PROFESIONALES Y OBREROS DISPONIBLES EN LA OBRA; LO CUAL INCLUYE AL EJECUTOR Y A LA SUPERVISION

RESUMEN DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DE LA CONTRATISTA

- **PERSONAL**

  01 Residente de obra
  01 Especialista en Obras de Arte e Ingeniería
  01 Especialista en Geología y Geotécnica
  01 Especialista en Medio Ambiente
  01 Especialista en Seguridad
  01 Ing. Asistente de Obra
  01 Secretaria
  01 Almacenero
  01 Capataz
  10 Operadores
  05 Operarios
  02 Oficiales
  01 Topógrafo
  10 Peones

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

- **Maquinaria y Equipos**
  05 Volquetes de 15. M3
  01 Cargador Frontal
  02 Excavadoras
  01 Motoniveladora
  01 Rodillo
  02 Cisternas
  01 Retroexcavadora
  03 Camionetas 4x4
  01 Combi
  01 Estación Total
  01 Gps Geodésico

RESUMEN DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

01 Jefe de Supervisión
01 Ing. Asistente
01 Especialista en Estructuras
01 Especialista en Seguridad

- **Maquinaria y Equipos**
  01 Camioneta 4x4.
  03 Lap tops
  01 Impresora multifuncional

h) JORNALES GENERADOS

Los jornales generados están especificados en el informe mensual del contratista agosto 2021

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

i) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La valorización presentada por el CONSORCIO VIAL SAN JUAN, ha sido revisada y aprobada por la Supervisión.
- El Avance de Obra del mes de agosto del 2021 es del 11.20 %, correspondiente a la Valorización N°03, la obra se encuentra atrasada.
- Se ha recibido la documentación por parte de la contratista de la documentación complementaria a la Valorización N° 03 – mes de agosto del 2021.
- No se han aplicado penalidades a la contratista en la V-03.
- La Supervisión revisó y aprobó los metrados presentados por la Contratista.
- La Supervisión realiza el control de la Póliza de Caución como garantía de Fiel Cumplimiento cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2021.
- La Supervisión como Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento, solicito la retención del 10.00 % de las valorizaciones presentadas.
- La Supervisión recomienda la cancelación de la Valorización N°03 de la Supervisión del mes de agosto del 2021 cuyo monto asciende a la suma S/. 45,036.23 (Cuarenta y Cinco Mil Treinta y Seis con 23/100 soles).

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174
JEFE DE SUPERVISION

j) PANEL FOTOGRAFICO

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

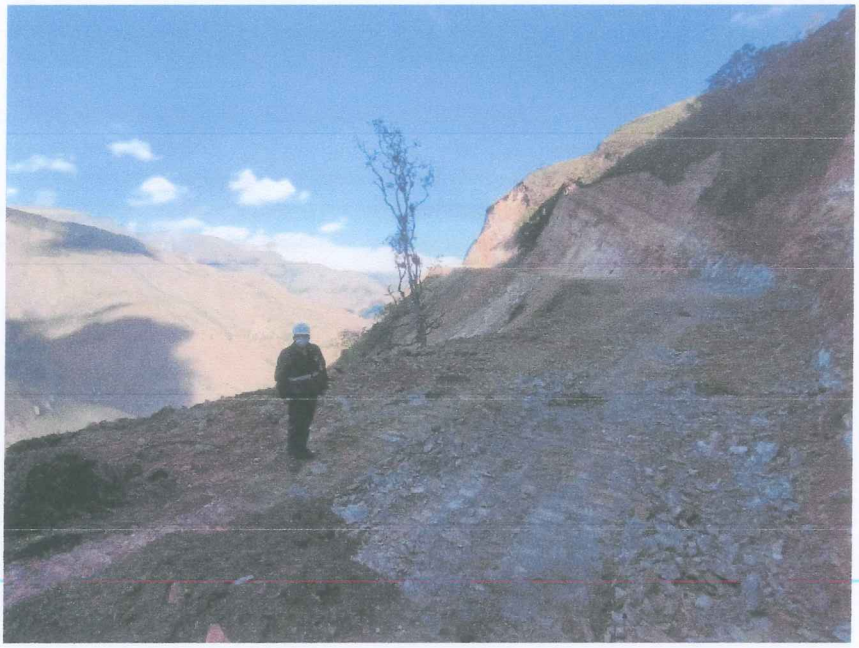

FOTOGRAFÍA 01: Jefe de supervisión presente en la variante en la progresiva KM. 20+900.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

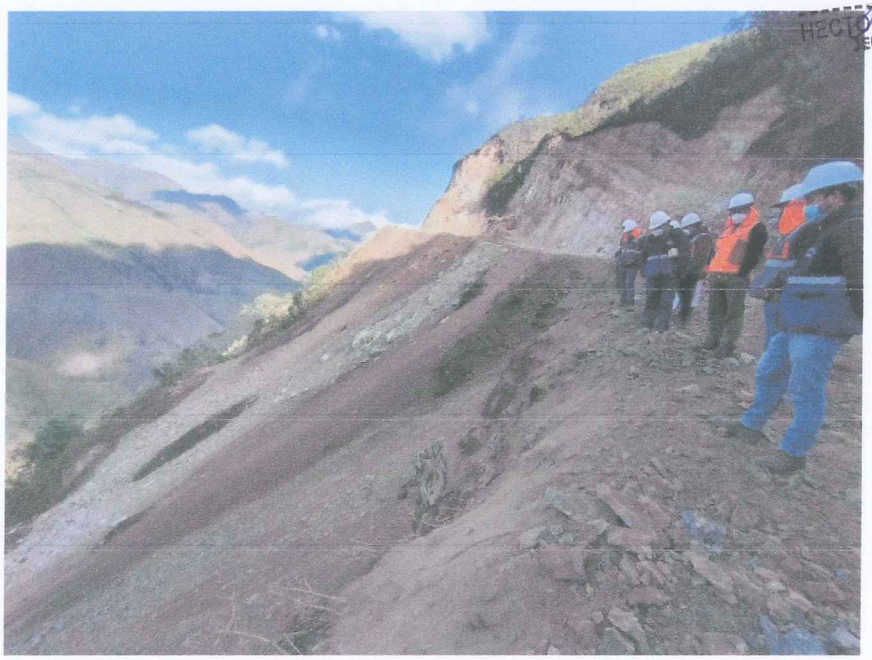

FOTOGRAFÍA 02: Inspección de la supervisión y contratista en la variante.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

FOTOGRAFÍA 03: Verificación de la supervisión junto con la entidad del puente n°01.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54124

FOTOGRAFÍA 04: Verificación de la supervisión junto con la entidad del puente n°02.

FOTOGRAFÍA 05: Verificación de la supervisión junto con la entidad del puente n°03.

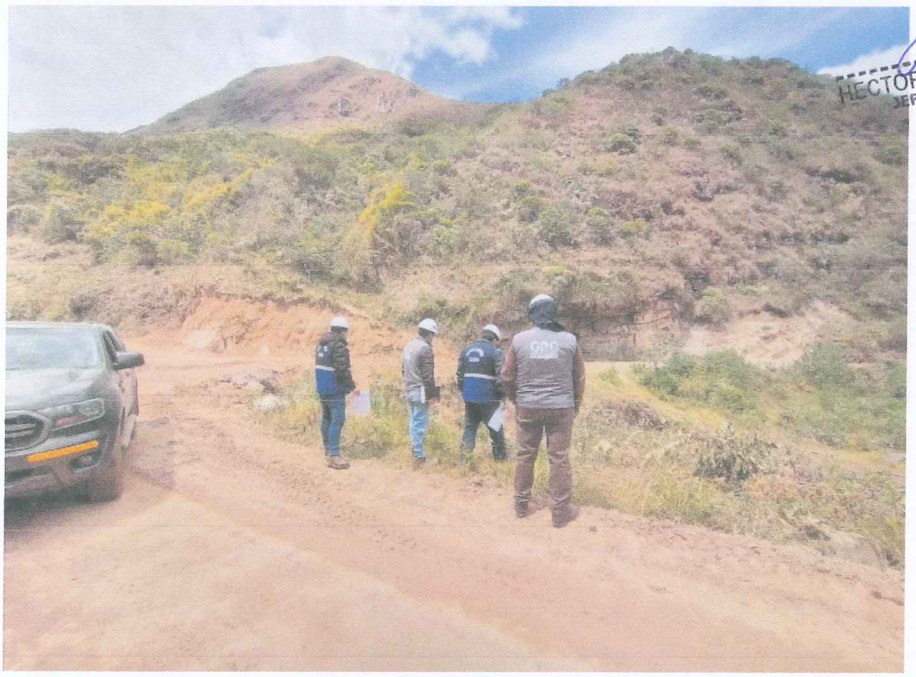

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFÍA 06: Verificación de la supervisión junto con la entidad del puente n°04.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

FOTOGRAFÍA 07: Supervisión Consorcio Eden y entidad GSRCH realizan inspección de la variante.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFÍA 08: Verificación de la longitud para ubicación del puente n°04.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

FOTOGRAFÍA 09: Verificación del trabajo del equipo topográfico en el puente n°04.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

FOTOGRAFÍA 10: Consorcio Eden verificando conformación de DME.

FOTOGRAFÍA 11: Verificación de la longitud para ubicación del puente n°03.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

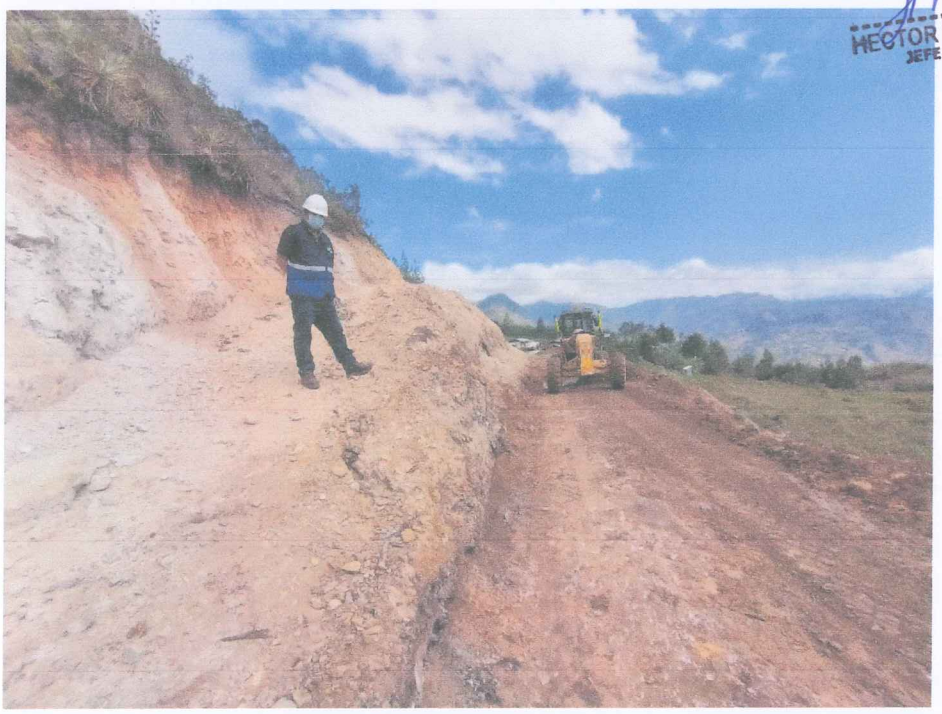

FOTOGRAFÍA 12: Verificación de la máquina motoniveladora realizando sus actividades.

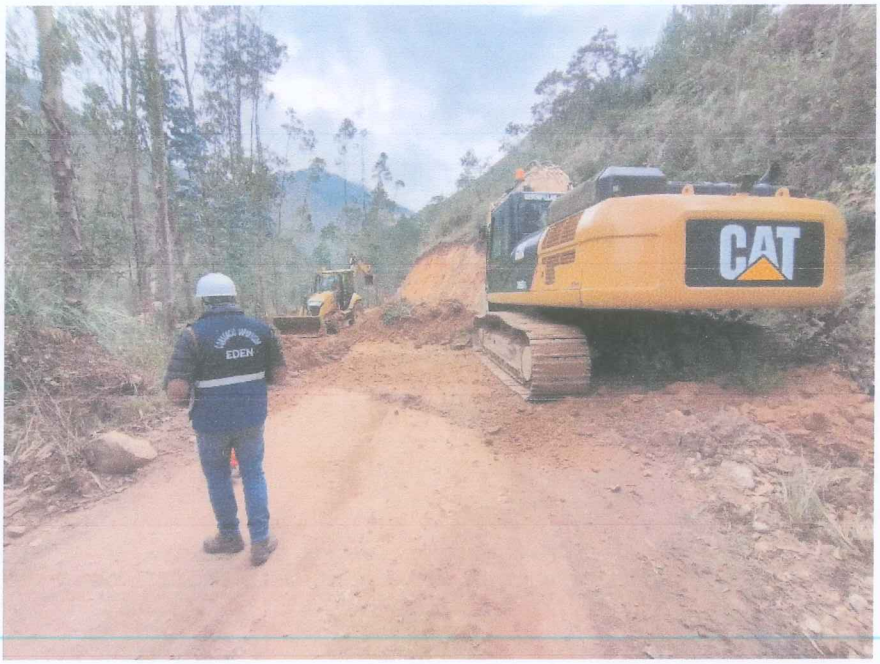

FOTOGRAFÍA 13: Verificación de la maquinaria realizando sus actividades diarias.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

FOTOGRAFÍA 14: Conformación del DME con ayuda de la retroexcvadora.

FOTOGRAFÍA 15: Verificación del ancho de plataforma de la carretera.

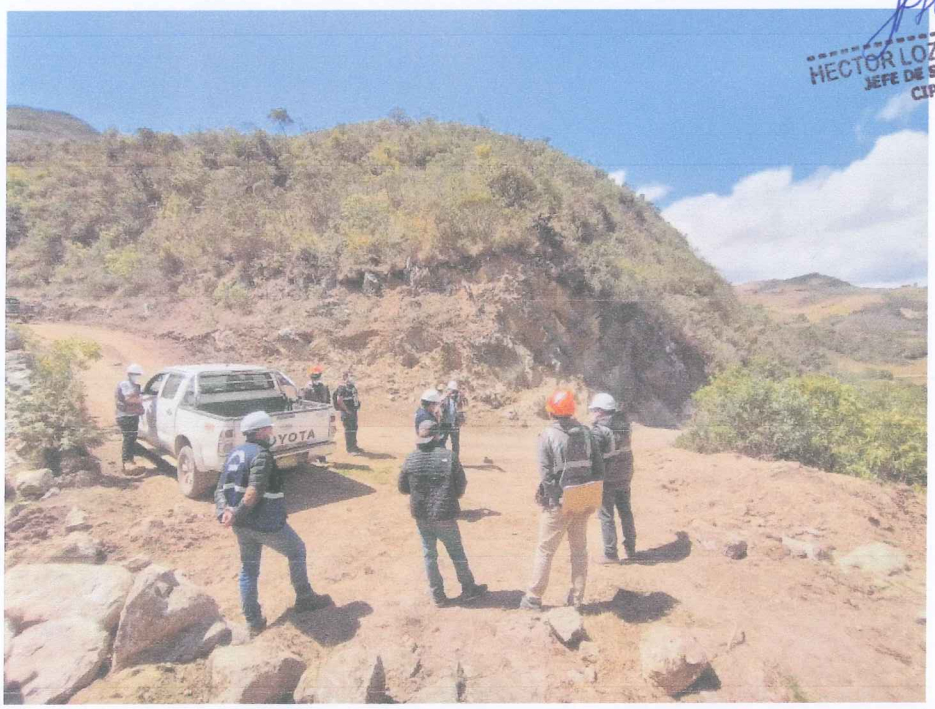

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFÍA 16: Reunión de la contrata y supervisión con poblador por la no disponibilidad de terreno tramo progresivas KM. 27+310 – 27+600.

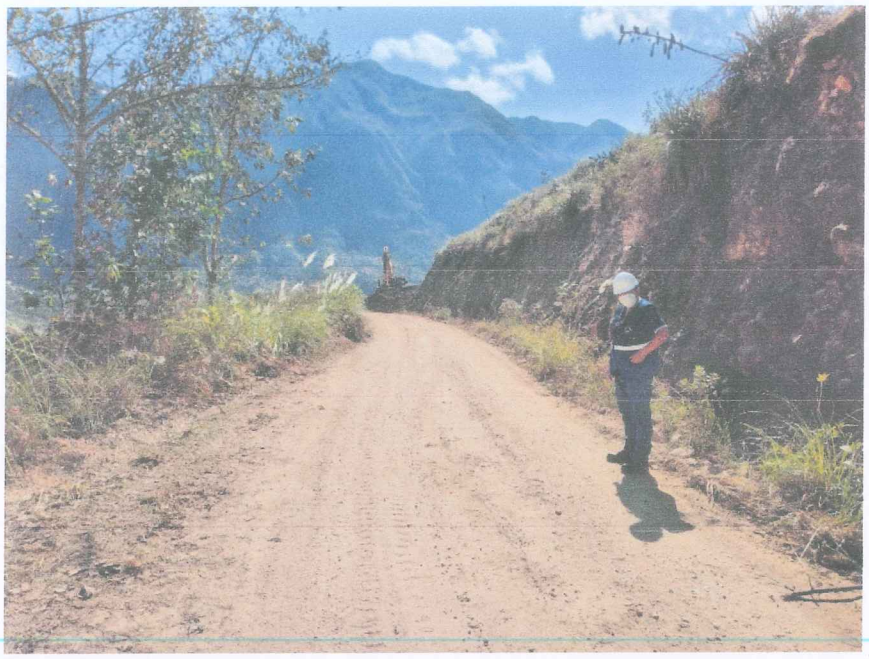

FOTOGRAFÍA 17: Verificación de la maquinaria trabajando correctamente.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94174

FOTOGRAFÍA 18: Visita técnica en obra para posible adicional sobre mejoramiento de sub rasante.

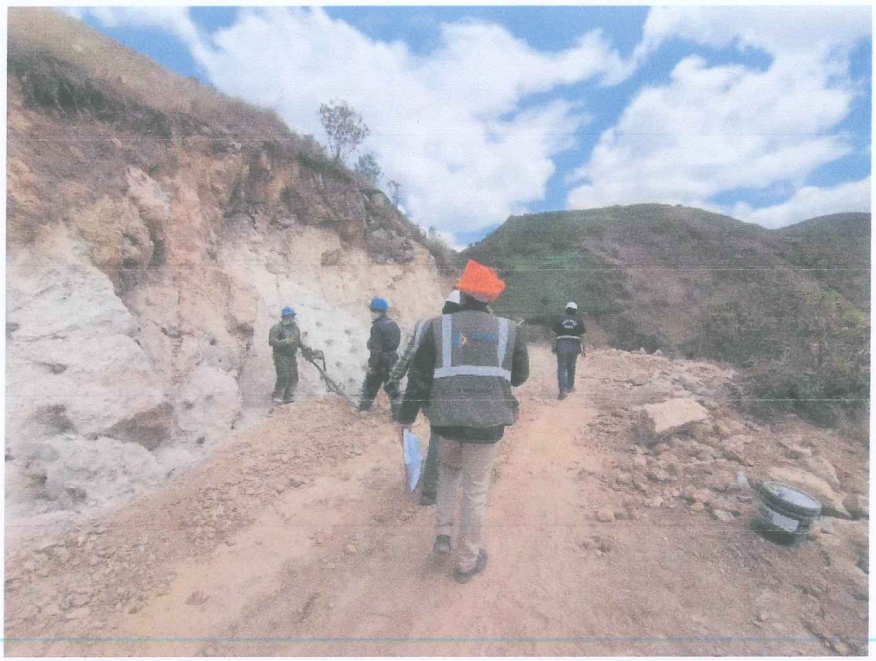

FOTOGRAFÍA 19: Verificación de trabajos de perforación.

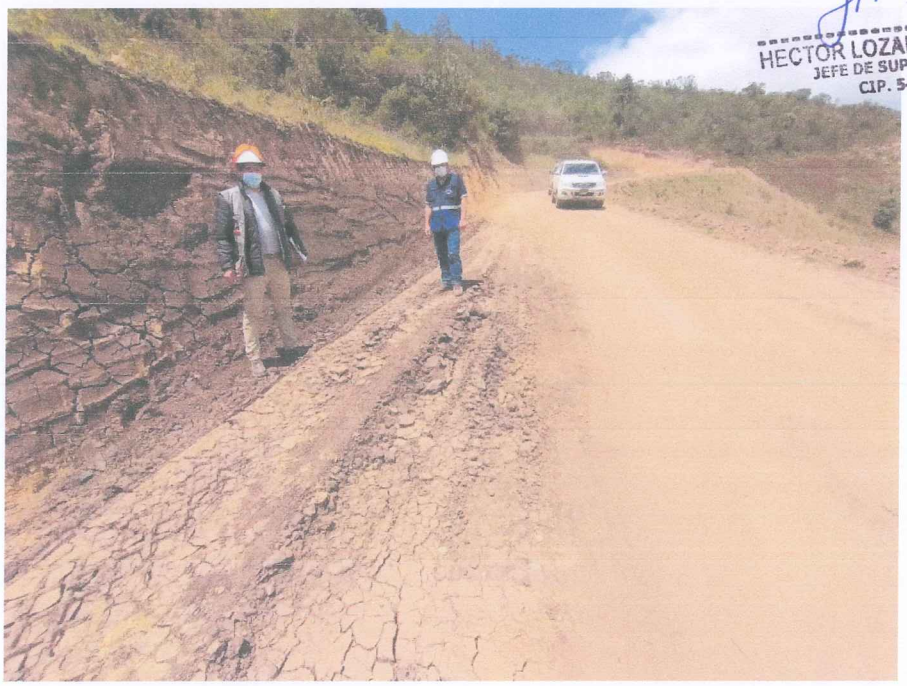

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFÍA 20: Verificación de la supervision del corte en talud.

FOTOGRAFÍA 21: Verificación de la cuadrilla encargada de la perforación en roca fija.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFÍA 22: Verificación del ancho mínimo de la carretera.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

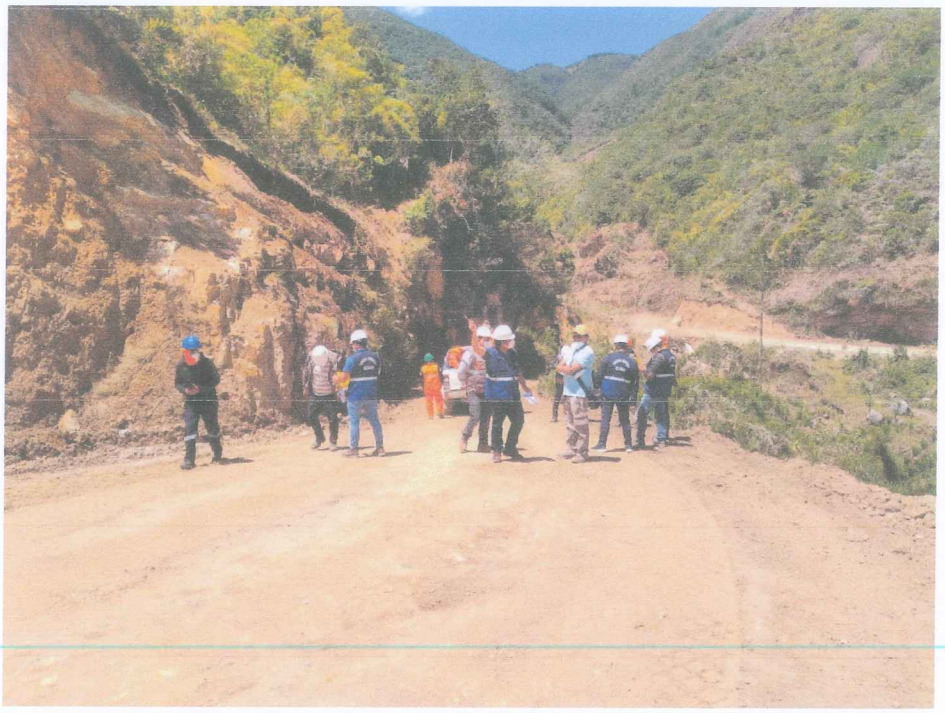

FOTOGRAFÍA 23: Salida a campo junto con la contratista para verificar trabajos de corte.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54134

FOTOGRAFÍA 24: Protocolo de seguridad contra COVID-19 con medición de temperatura.

k)COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 122

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 02/08/2021 22:15

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 123

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 02/08/2021 22:25

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 124

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 02/08/2021 22:26

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 125

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 03/08/2021 21:44

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 126

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 03/08/2021 22:49

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 127

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 04/08/2021 22:23

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 128

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 04/08/2021 22:34

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 129

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 05/08/2021 22:38

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 130

Título ACITIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 05/08/2021 23:18

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 131

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 06/08/2021 22:45

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: ACTIVIDADES DIARIAS

El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.

Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 132

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 06/08/2021 22:53

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICANLOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS Y EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 133

Título MAYOR METRADO ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Fecha y Hora 06/08/2021 23:41

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Se comunica a la supervisión que, el día jueves 05 de agosto del 2021 cuando se venía ejecutando la partida de corte de material, se produjo un derrumbe en el tramo de las progresivas 18+520 al 18+600, aproximadamente a las 3:00 p.m; al, producto de la debilidad de la cohesión interna de los materiales conformantes en la progresiva 18+520,

Dicha labor se ejecutaba con la excavadora 329 D L, la cual no sufrió daños, ya que al momento del derrumbe se estaba trasladando más adelante para seguir cortando.

En relación a ello, de acuerdo a la especificación técnica 02.05.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXPLANACIONES, del expediente técnico, indica que: El Contratista, efectuará la eliminación de material que excedentes de las zonas de corte de material suelto, roca suelta, roca fija, y también la eliminación de material a consecuencia de derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la plataforma de la carretera, obstaculizando el tráfico. El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el material proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc.

En ese sentido, se solicita a la supervisión la verificación in situ del derrumbe y la cuantificación de volumen de material a eliminar; Así mismo, se solicita la autorización para ejecutar mayores metrados producto del derrumbe en la partida de eliminación de material excedente de explanaciones.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

asiento derrumbe.pdf

Hash 256: 7ac9fec19f95be9a5cee8122618f469ebaf81de36c0f883a9659fe6d05a66c92

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 134

Título DESLIZAMIENTO DE TERRENO PROGRESIVA 20+850

Fecha y Hora 07/08/2021 00:18

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: DESLIZAMIENTO DE TERRENO EN LA PROGRESIVA 20+850

Se comunica a la supervisión el día martes 03 de agosto del 2021 se produjo un deslizamiento al momento del corte, producto de la debilidad de la cohesión interna de los materiales conformantes presentando franjas favorables para la percolación de las aguas que emergen debajo de la roca, las que por lavado de los sedimentos finos originan inicialmente agrietamientos longitudinales para luego colapsar y desplazarse a través de una superficie de deslizamiento, también, por sobresaturación de los materiales por efectos de las precipitaciones, las mismas que se infiltran y rompen el equilibrio de los estratos del suelo produciendo un gran resbalamiento.

Este hecho generó la paralización de los trabajos de corte en el tramo de las progresiva 20+850 al 19+750.

El día miércoles 04 de agosto se realizó conjuntamente con la supervisión, la evaluación in situ del deslizamiento.

En ese sentido, se solicita a la supervisión, se nos indique, ¿Cómo se procederá ante la ocurrencia del deslizamiento?

Así mismo, se solicita a la supervisión la autorización formal de la paralización de la ejecución de partidas de explanaciones en el tramo de las progresiva 20+850 al 19+750, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad mínimas para desarrollar los trabajos, además, no se garantiza la estabilidad de la vía.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

ASIENTO DESLIZAMIENTO KM 20.pdf

Hash 256: afbf1d1e96475f363bfc48e2c0673125c7e0a424b0f2e51bfb9119a3ec64eb7f

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 135

Título SOLICITO AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS.

Fecha y Hora 07/08/2021 00:53

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: En observancia con el numeral 205.10 del artículo 205 del reglamento de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, El contratista, mediante el Residente de Obra solicita la Ejecución de Mayores Metrados en Movimiento de Tierras, específicamente en las partidas de:
•corte en material suelto •corte en material Roca suelta •corte en material Roca fija •Eliminación de material de explanaciones •Acondicionamiento de depósitos de material excedente.
de acuerdo a los planos de replanteo y de diseño geométrico presentados mediante cartas:

- CARTA N°002-2021-RCTZ/RO (Contratista), de fecha 20 de junio de 2021.
- CARTA N°006-2021-RCTZ/RO (Contratista), PRESENTACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 27+000 A LA PROGRESIVA 30+000, PARA SU APROBACIÓN. de fecha 01 de julio de 2021
- CARTA N°009-2021-RCTZ/RO (Contratista), PRESENTACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 22+000 A LA PROGRESIVA 27+000, PARA SU APROBACIÓN, de fecha 17 de julio de 2021
- CARTA N°010-2021-RCTZ/RO (Contratista), PRESENTACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 10+000 A LA PROGRESIVA 22+000, PARA SU APROBACIÓN, de fecha 21 de julio de 2021)

aprobadas por la supervisión con cartas:

- CARTA N°004-2021/HLS/JS/CSE (Supervisor), APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 30+000 A LA PROGRESIVA 32+736, con fecha 20 de junio de 2021.
- CARTA N°005-2021/HLS/JS/CSE (Supervisor), APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 27+000 A LA PROGRESIVA 30+000. Con fecha 01 de julio de 2021
- CARTA N°006-2021/HLS/JS/CSE (Supervisor), APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 22+000 A LA PROGRESIVA 27+000 Con fecha 17 de julio de 2021.
- CARTA N°007-2021/HLS/JS/CSE (Supervisor), APROBACIÓN DE PLANOS DE REPLANTEO DE LA PROGRESIVA 10+000 A LA PROGRESIVA 22+000

En ese sentido, se SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN EL TRAMO DE LAS PROGRESIVAS 10+000 AL 32+736 según los volúmenes que se indican en los planos aprobados mencionados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

SOLICITO AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS.pdf

Hash 256: f739f7e76c7cf6d9e1fd33852f657e3442a1d0244c8e8e6338948e2746505339

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 136

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 07/08/2021 20:28

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 137

Título ACTIVADES DIARIAS

Fecha y Hora 07/08/2021 23:36

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 138

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 09/08/2021 20:15

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 139

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 09/08/2021 21:35

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICAN LOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 140

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 10/08/2021 20:30

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 141

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 10/08/2021 21:06

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICARON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 142

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 11/08/2021 19:39

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 143

Título RESPUESTA DE ASIENTO Nº133 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 11/08/2021 21:28

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: RESPECTO A LO SUSCITADO EL DIA JUEVES 05 DE AGOSTO DEL 2021 INDICADO EN EL ASIENTO Nº133 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE VERIFICO QUE EFECTIVAMENTE SE PRODUJO UN DERRUMBE, Y DE LA MISMA MANERA SE CUANTIFICO EL VOLUMEN INSITU PARA SU POSTERIOR ELIMINACION, ESTE HECHO SE EVIDENCIO MEDIANTE FOTOGRAFIAS ADJUNTAS EN EL ASIENTO RESPECTIVO DEL RESIDENTE.

Asiento de Referencia: 133 - MAYOR METRADO ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 144

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº134 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 11/08/2021 21:35

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ASIENTO Nº134 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE VERIFICO INSITU EL DESLIZAMIENTO DEL TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS 20+850 al 19+750, DE ESTA MANERA SE AUTORIZO LA PARALIZACION DE TRABAJOS EN EL TRAMO SEÑALADO, HASTA REALIZAR LA EVALUACION CORRESPONDIENTE Y DEFINIR LA CONTINUACION DE TRABAJOS EN ESTE TRAMO, ESTE HECHO SE EVIDENCIO MEDIANTE FOTOGRAFIAS ADJUNTAS EN EL ASIENTO RESPECTIVO DEL RESIDENTE.

DE LA INSPECCION REALIZADA CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA EL DIA MARTES 10-08-2021 SE VERIFICO QUE, NO SE HAN PRODUCIDO MAYORES DESLIZAMIENTOS, POR LO QUE SE OPTO EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN EL TRAMO EN REFERENCIA.

Asiento de Referencia: 134 - DESLIZAMIENTO DE TERRENO PROGRESIVA 20+850

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84179

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 145

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº135 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 11/08/2021 21:37

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN RESPUESTA A LO INDICADO EN EL ASIENTO Nº135 DEL RESIDENTE DE OBRA RESPECTO A LOS MAYORES METRADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS 10+000 AL 32+736, LOS PLANOS REPLANTEADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS INDICADAS, HAN SIDO APROBADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA DONDE SE HAN EVIDENCIADO MAYORES METRADOS RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO.

Asiento de Referencia: 135 - SOLICITO AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS.

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 146

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 11/08/2021 22:02

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 147

Título SOLICITUD DE INTERVENCION EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAMO 0+000 AL 10+000

Fecha y Hora 12/08/2021 12:28

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Habiéndose presentado mediante Carta N° 013-2021-RCTZ/RO de fecha 12/08/2021, los planos de replanteo en el tramo de las progresivas 0+000 al 10+000, SOLICITO AUTORIZACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA EJECUTAR PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS tales como: Corte en Material Suelto, Corte en Roca Suelta, Corte en Roca Fija, Relleno con material propio, Eliminación de Material de Explanaciones y Acondicionamiento de Depósitos de Material Excedente, en dicho tramo y de acuerdo a la clasificación del tipo de material.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 148

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 12/08/2021 19:22

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 149

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 12/08/2021 22:40

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DIA DE HOY SE VERIFICARON LOS TRABAJOS REALIZADOS DE TRAZO Y REPLANTEO, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 150

Título COMUNICO ABSOLUCIÓN A CONSULTA PENDIENTE.

Fecha y Hora 13/08/2021 15:58

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: COMUNICO LA ESPERA DE, RESPUESTA DE LA ENTIDAD A CONSULTAS RESPECTO A OBRAS DE ARTE. PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE N° 01 Y AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.

Asiento de Referencia: 117 - ABSOLUCION DE CONSULTAS

Archivos anexos: 02

INFORME N° 006_2021 PROGRAMACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PUENTE N01 RIO LANCHE-f .pdf

Hash 256: 5334d24b3d929ddae10b79bfc71795916e50e8db69540e826a5cf8419fb4bfea

14.- CARTA N° 014 -ESPERA DE RESPUESTA DE ENTIDAD.pdf

Hash 256: 35f4b5025ebcae6eff615393e3e53a5ba3202a10c48aa11f81a4302962df4c62

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 151

Título COMUNICO NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA

Fecha y Hora 13/08/2021 18:35

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Mediante el presente asiento se comunica a la supervisión la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra para la PREPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LA CAPA DE SUB RASANTE. En ese sentido se adjunta el sustento respectivo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 03

15.- CARTA No 015 NECESIDAD DE ADICIONAL POR MEJORAMIENTO.pdf

Hash 256: c0f8e30837099bb131eed1f096408e315123e68d880eb625f69543f3f96458ad

INFORME ING VARGAS.pdf

Hash 256: 85fa489e0f549dd22a26b6f59b4a6ecc9523c5eaebb180a93a1ed0d95001b556

INFORME 05 EVALUACION DE PLATAFORMA (2).pdf

Hash 256: e6386a226e63281b7e2a92ad16bb42f9c9372fad84e34ecd5950556ee59c52f5

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 152

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 13/08/2021 18:37

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 153

Título SOLICITUD DE INTERVENCION EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAMO 0+000 AL 10+000

Fecha y Hora 13/08/2021 22:31

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE HA RECEPCIONADO LA CARTA Nº013-RCTZ/RO, CONTENIENDO LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 10+000, POR LO QUE SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA

Asiento de Referencia: 147 - SOLICITUD DE INTERVENCION EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAMO 0+000 AL 10+000

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 154

Título ABSOLUCION DE CONSULTAS

Fecha y Hora 13/08/2021 22:40

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE RESPECTO A LAS OBRAS DE ARTE, ESTAS FUERON ABSUELTAS POR LA SUPERVISION EN EL ASIENTO Nº117 DE FECHA 30-07-2021.

RESPECTO A LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA ENTIDAD SE INDICA LO SIGUIENTE:
1.- RESPECTO AL PLANO DE DETALLES DE ANCLAJES DE BARANDAS DE FºGº DE PUENTES: A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA.
2.- CONSULTAS SOBRE LA NESECIDAD DE CONSIDERAR SOLADOS PARA LAS ZAPATAS DE ESTRIBOS DE PUENTES: A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA.
3.- CONSULTA SOBRE ACLARAR EL NUMERO DE BADENES A CONSIDERAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA: A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA.

ASI MISMO SE INDICA QUE MEDIANTE CARTA Nº011-2021/RRV/RL/CSE, DE FECHA 27 DE JULIO, SE SOLICITO A LA ENTIDAD LOS PLANOS DE PLANTA Y PERFIL DE LOS 04 PUENTES DEL PROYECTO Y A LA FECHA NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA.

SE ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LA ENTIDAD PARA QUE SE NOS ALCANCEN LOS RESPECTIVOS PLANOS ANTES QUE AFECTE LA RUTA CRITICA, DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA.

Asiento de Referencia: 150 - COMUNICO ABSOLUCIÓN A CONSULTA PENDIENTE.

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 155

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 13/08/2021 22:43

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO.
-SE VERIFICA TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL SUELTO.
-SE VERIFICAN TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE UTILIZANDO MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
-TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA.
-SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 156

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 14/08/2021 18:18

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 157

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 14/08/2021 22:19

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO.
-SE VERIFICA TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL SUELTO.
-SE VERIFICAN TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE UTILIZANDO MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
-TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS DE TIERRA.
-SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

096

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 158

Título CONSULTA

Fecha y Hora 16/08/2021 12:20

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Ante la existencia de superposición de ejes desde la progresivas 11+360 hasta 11+400 del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N BAMBAMARCA – PACCHA – CHIMBÁN – PIÓN – L.D. CON AMAZONAS, EMP. AM-103 – EL TRIUNFO" y desde las progresivas 00+000 hasta 00+050 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN, CAJAMARCA", detalladas en el informe adjunto, se formula la siguiente consulta:
¿ES POSIBLE QUE, SE NOS ENTREGUE EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA INTERSECCIÓN (EMPALME), DE LAS DOS VÍAS?, O CASO CONTRARIO
¿QUIÉN ASUME EL NUEVO DISEÑO GEOMÉTRICO?

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

INFORME N° 002 rev_01.pdf

Hash 256: 6cf6cf0a55a299b8245fdc879116035e7a20c35a38835d7cb90719cac28e5eeb

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54170

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 159

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 16/08/2021 19:11

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 160

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº151 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 16/08/2021 22:10

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SOBRE NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACION ADICIONAL.

Mediante Carta N°015 -2021-RCTZ/RO se informa a la supervisión la necesidad de ejecutar una prestación adicional. Así mismo adjuntan el Informe N°005-2021-JAMQ/GEOLOGIA Y GEOTECNIA y el Informe Geotécnico.

Al respecto se informa que de la Revisión del Informe N°005-2021-JAMQ/GEOLOGIA Y GEOTECNIA, en el numeral 3.-
RESULTADOS DE VERIFICACION EN CAMPO se indica "en el Expediente Técnico revisado, a lo largo de todo el tramo no hay una partida específica que indique mejoramiento de vía, es por ello, que se hace la consulta a la supervisión si es posible generar una partida para mejoramiento a nivel de sub rasante".

Como se aprecia el Informe N° 005-2021-JAMQ/GEOLOGIA Y GEOTECNIA, indica que debe realizarse una CONSULTA a la supervisión sobre la necesidad de generar una partida para mejoramiento a nivel de sub rasante y en el asiento están considerando como una PRESTACION ADICIONAL DE OBRA.

La supervisión recomienda que para efectos de cumplir con los requerimientos del Art. 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, lo solicitado considerarlo en el Cuaderno de Obra como una Consulta.

Asiento de Referencia: 151 - COMUNICO NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

093

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 161

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 16/08/2021 22:14

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL SUELTO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE UTILIZANDO MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS EN TIERRA.
- SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

092

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 162

Título CONSULTA SOBRE LA NECESIDAD DE EJECUTAR PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

Fecha y Hora 17/08/2021 19:15

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Mediante el presente asiento de obra se acoge a la sugerencia de la supervisión en el asiento N° 160 y se realiza la consulta sobre la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra para la PREPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LA CAPA DE SUB RASANTE.
En ese sentido, se adjunta los INFORMES N° 005-2021-JAMQ/GEOLOGÍA Y GEOTECNIA e informe geotécnico donde se detalla los tramos a intervenir.
De lo expuesto, se plantea la siguiente consulta:
Ante la necesidad de Preparar y Mejorar el suelo de la capa de sub rasante, ¿Las supervisión y Entidad aprobaran el adicional de obra de la partida "PREPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LA CAPA DE SUB RASANTE ", no contemplado en el expediente técnico?

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 163

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 17/08/2021 19:17

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: El día de hoy se continuó ejecutando las partidas:

- Trazo y replanteo en carreteras
- Corte de material según la reclasificación realizada.
- Perfilado y compactado de subrasante.
- Conformación de Cunetas
- En el área de seguridad, se viene administrando el plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Así mismo, se viene dotando de equipos de protección individual y colectiva.
- Además, se ha realizado la señalización de seguridad y el personal está recibiendo la capacitación en seguridad y salud.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 164

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 17/08/2021 21:02

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL SUELTO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE UTILIZANDO MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS EN TIERRA.
- SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

089

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 165

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 18/08/2021 18:58

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HÉCTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

088

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 166

Título COMUNICO INTERFERENCIA POR TERRENO NO LIBERADO

Fecha y Hora 18/08/2021 19:10

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Mediante la presente se deja constancia de la falta de disponibilidad de terreno en el tramo de las progresivas 27+310 hasta la progresiva 27+600, por
Al respecto, el día de hoy 18/08/2021 se tuvo una reunión con el Teniente Gobernador del Caserío Unión del Norte, La supervisión y el Contratista, para constatar la interferencia en mención. En dicha reunión se realizó un acta, el cual se adjunta al presente asiento y donde se detalla las acciones realizadas tanto por el contratista y la supervisión.
En ese sentido, se solicita a la supervisión y entidad la liberación del terreno de dicho tramo para continuar con la ejecución de los trabajos.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 167

Título ADJUNTO ACTA DE REUNIÓN

Fecha y Hora 18/08/2021 19:33

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Mediante el presente asiento se comunica que por error material no se adjunto el acta de reunión de realizado el día de hoy en el asiento N° 166. Por lo que en el presente asiento se adjunta dicha acta.

Asiento de Referencia: 166 - COMUNICO INTERFERENCIA POR TERRENO NO LIBERADO

Archivos anexos: 01

Adobe Scan 18 ago. 2021.pdf

Hash 256: 069aa9d4c6608723e342dbed4b81c19944e3dea9eb57ddfadbbc4138b8268f7f

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 168

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 18/08/2021 20:53

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL SUELTO.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE UTILIZANDO MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- SE VERIFICAN TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS EN TIERRA.
- SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

085

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 169

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 19/08/2021 19:17

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 170

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 19/08/2021 21:28

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: -SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO
-CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION REALIZADA
-PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
-CONFORMACION DE CUNETAS
-SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID - 19

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

083

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 171

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº158 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 20/08/2021 18:31

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CON RESPECTO A LO SOLICITADO POR LA CONTRATISTA EN EL ASIENTO Nº158 DEL RESIDENTE DE OBRA SE INFORMA QUE; AL INICIAR LOS TRABAJOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0 +000 – 0+050 DE LA OBRA CORRESPONDIENTE, SE HA VERIFICADO QUE EXISTE UNA SUPERPOSICIÓN DE TRABAJOS CON EL TRAMO ENTRE LAS PROG. 11+360 – 11+400 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N BAMBAMARCA – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D. CON AMAZONAS, EMP.AM-103 – EL TRIUNFO", POR LO QUE SE ESTA GENERANDO UNA DUPLICIDAD DE TRABAJOS ENTRE LOS TRAMOS INIDICADOS DE AMBOS PROYECTOS.

CON LA FINALIDAD DE PRECISAR LA COTA DE LLEGADA EN EL TRAMO DE LAS PROG. KM 0 +000 – 0+050 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN, CAJAMARCA", SE COMUNICARA A LA ENTIDAD SOLICITAR A QUIEN CORRESPONDA, LOS PLANOS DE PLANTA Y PERFIL DEL TRAMO ENTRE LAS PROG. 11+360 – 11+400 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N BAMBAMARCA – PACCHA – CHIMBAN – PION – L.D. CON AMAZONAS, EMP.AM-103 – EL TRIUNFO"

Asiento de Referencia: 158 - CONSULTA

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

082

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 172

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº162 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 20/08/2021 18:34

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: RESPECTO AL ASIENTO Nº162 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE, MEDIANTE CARTA Nº015-2021/RRV/RL/CSE DE FECHA 20-08-2021, SE TRASLADO A LA ENTIDAD LA CONSULTA SOBRE LA NECESIDAD DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA.

Asiento de Referencia: 162 - CONSULTA SOBRE LA NECESIDAD DE EJECUTAR PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

081

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 173

Título RESPUESTA AL ASIENTO Nº166 DEL RESIDENTE DE OBRA

Fecha y Hora 20/08/2021 18:37

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: RESPECTO AL ASIENTO Nº166 DEL RESIDENTE DE OBRA SE INFORMA QUE, A LA FECHA NO SE PUEDE INTERVENIR EN EL TRAMO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27 +310 - KM 27 + 600, DONDE EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERA LA AFECTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS EN UNA FRANJA DE 290 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS.

A PESAR DE LAS COORDINACIONES Y GESTIONES DE LA CONTRATISTA CON EL PROPIETARIO Y AUTORIDADES DEL LUGAR, NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO, POR LO QUE LA CONTRATISTA SOLICITA A LA ENTIDAD LA LIBERACIÓN DEL TERRENO EN EL TRAMO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27 +310 - KM 27 + 600, Y DE ESTA MANERA CONTINUAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

ASI MISMO SE ESTARA ALCANZANDO A LA ENTIDAD EL REQUERIMIENTO SOLICITADO SOBRE LA LIBERACION DE TERRENO ENTRE ESTAS PROGRESIVAS.

Asiento de Referencia: 166 - COMUNICO INTERFERENCIA POR TERRENO NO LIBERADO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 174

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 20/08/2021 18:42

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 175

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 20/08/2021 19:56

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE: -TRAZO Y REPLANTEO
-CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION REALIZADA.
-PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE.
-CONFORMACION DE CUNETAS.
-SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 176

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 21/08/2021 18:41

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 177

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 21/08/2021 22:02

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: se continuan los trabajos de : TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS; CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION; CONFORMACION DE CUNETAS; SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 178

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 23/08/2021 20:10

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR OZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 56174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 179

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 23/08/2021 20:54

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS; CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION; CONFORMACION DE CUNETAS; SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 180

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 24/08/2021 19:35

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 181

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 24/08/2021 21:17

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS; CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION; PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS; SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 182

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 25/08/2021 20:01

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 183

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 25/08/2021 21:26

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS; CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION; PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS; SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID 19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 184

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 26/08/2021 20:17

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.
ASIMISMO SE REPORTA LA PRESENCIA DE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES DURANTE EL DÍA Y DESDE LA NOCHE ANTERIOR, LO CUAL DIFICULTA EL AVANCE EN OBRA

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

TimePhoto_20210826_133122.jpg

Hash 256: a1936b4e48a268e61a3d419103a588e6b7772ca395657eb4517d9cb7b2fdb2ba

TimePhoto_20210826_133116.jpg

Hash 256: 16fd18e6aca025a22a0cbeace77589a4375edfb93a5c6e901b4350e1c99fb66a

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 185

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 26/08/2021 22:09

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19. SE VERIFICA PRESENCIA DE LLUVIAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 186

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 27/08/2021 20:14

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 187

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 27/08/2021 22:20

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 188

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 28/08/2021 20:03

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS: • TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS • CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA. • PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE. • CONFORMACIÓN DE CUNETAS • EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. • ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. • ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.
ASÍ MISMO, SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL PERIODO (DIA 27/08 DESDE 23:00 HORAS HASTA 03:00 HORAS DEL DIA 28/08) Y (EL DIA DE HOY DESDE LAS 15:00 HORAS HASTA LAS 17:30 HORAS). POR LO QUE SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, CORTE DE MATERIAL, ELIMINACIÓN DE MATERIAL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

ING. ... LLANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 189

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 28/08/2021 21:32

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID -19; ASI MISMO SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 190

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 30/08/2021 20:39

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS:
• TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS
• CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA.
• PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE.
• CONFORMACIÓN DE CUNETAS
• EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
• ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
• ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

ASÍ MISMO, SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES DESDE LAS 15:00 HORAS HASTA LAS 18:30 HORAS). POR LO QUE SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, CORTE DE MATERIAL, ELIMINACIÓN DE MATERIAL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 191

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 30/08/2021 21:45

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID -19; ASI MISMO SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 192

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 31/08/2021 20:12

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUÓ EJECUTANDO LAS PARTIDAS:
• TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS
• CORTE DE MATERIAL SEGÚN LA RECLASIFICACIÓN REALIZADA.
• PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE.
• CONFORMACIÓN DE CUNETAS
• EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, SE VIENE ADMINISTRANDO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
• ASÍ MISMO, SE VIENE DOTANDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
• ADEMÁS, SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EL PERSONAL ESTÁ RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 193

Título METRADOS EJECUTADOS AGOSTO -2021

Fecha y Hora 31/08/2021 22:20

Usuario: TINOCO ZARATE, ROBERTO CARLOS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: EL DÍA DE HOY 31/08/21 CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN, SE CONCILIO EN CAMPO, LOS METRADOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LOS TRAMOS PROGRESIVAS KM 10+000 AL KM 22+000, APROBADOS CON CARTA N°007-2021/HLS/JS/CSE, (21/07/2021), (KM 10+000 AL KM 22+000), PLANOS DE REPLANTEO QUE SIRVIERON PARA LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO A LOS METRADOS ADJUNTOS EN EL PRESENTE ASIENTO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

hoja valorizacion 3 (1).pdf

Hash 256: 290bb3e70e796627e83bbe723de20e32881295acf9c0860b2e01ec57d414bf93

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 194

Título ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha y Hora 31/08/2021 23:19

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERA, CORTE EN MATERIAL SEGUN RECLASIFICACION, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE CUNETAS, SE CUMPLE CON EL PLAN DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84176

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLÁN, PROV. DE HUALGAYOC Y CELENDÍN ¿CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIAL SAN JUAN

Número de asiento: 195

Título CONCILIACION DE METRADOS

Fecha y Hora 31/08/2021 23:23

Usuario: LOZANO SALDAÑA, HECTOR

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: EN LA FECHA CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, SE CONCILIARON LOS METRADOS CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACIÓN Nº03 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, SE SOLICITA ALCANZAR A LA SUPERVISIÓN EL INFORME COMPLEMENTARIO DE LA VALORIZACIÓN Nº03.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84194

I)VALORIZACION DEL MES DEL INFORME

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94376

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
Item	Descripcion	Unid	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
	MEJ CV TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA																
01	OBRAS PRELIMINARES																
01.01	CARTEL DE OBRA 2.40x4.80m.	und	1,00	1.626,14	1.626,14	1,00	1.626,14	100,00%	-	-	-	1,00	1.626,14	100,00%	-	-	-
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1,00	67.786,61	67.786,61	0,50	33.893,31	50,00%	-	-	-	0,50	33.893,31	50,00%	0,50	33.893,31	50,00%
01.03	CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA	GLB	2,00	10.000,00	20.000,00	1,60	16.000,00	80,00%	-	-	-	1,60	16.000,00	80,00%	0,40	4.000,00	20,00%
01.04	TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS	KM	32,74	3.560,17	116.559,97	8,18	29.122,19	24,98%	14,56	51.836,08	44,47%	22,74	80.958,27	69,46%	10,00	35.601,70	30,54%
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	150.272,50	3,43	515.434,68	63.186,14	216.728,46	42,05%	67.243,96	230.646,78	44,75%	130.430,10	447.375,24	86,80%	19.842,40	68.059,43	13,20%
02.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	16.524,23	23,73	392.119,98	10.668,45	253.636,92	64,68%	3.454,20	81.968,17	20,90%	14.142,65	335.605,08	85,59%	2.381,58	56.514,89	14,41%
02.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	6.324,75	26,68	168.744,33	-	-	-	1.527,47	40.752,90	24,15%	1.527,47	40.752,90	24,15%	4.797,28	127.991,43	75,85%
02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	24.838,70	5,51	136.861,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.838,70	136.861,24	100,00%
02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXPLANACIONES	m3	177.939,32	2,79	496.450,70	85.720,93	239.161,39	48,17%	86.670,75	241.811,39	48,71%	172.391,68	480.972,79	96,88%	5.547,64	15.477,92	3,12%
02.06	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MAETRIAL EXCEDENTE	m3	177.939,32	1,94	345.202,28	85.720,93	166.298,60	48,17%	86.670,75	168.141,26	48,71%	172.391,68	334.439,86	96,88%	5.547,64	10.762,42	3,12%
03	PAVIMENTOS																
03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	208.190,16	0,99	206.108,26	-	-	-	3.878,40	3.839,62	1,86%	3.878,40	3.839,62	1,86%	204.311,76	202.268,64	98,14%
03.02	EXTRACCIÓN	m3	69.658,43	7,41	516.168,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.658,43	516.168,97	100,00%
03.03	ZARANDEO	m3	69.658,43	1,83	127.474,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.658,43	127.474,93	100,00%
03.04	CARGUIO	m3	69.658,43	1,44	100.308,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.658,43	100.308,14	100,00%
03.05	TRANSPORTE	m3	69.658,43	4,51	314.159,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.658,43	314.159,52	100,00%
03.06	BASE e=0.28 m.	m3	69.658,43	5,37	374.065,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.658,43	374.065,77	100,00%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
04.01	EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (SOBRE EL N.	m3	5.471,75	4,94	27.030,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.471,75	27.030,45	100,00%
04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS	m3	1.954,94	13,82	27.017,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954,94	27.017,27	100,00%
05	ALCANTARILLAS TMC Ø 24"																
05.01	ALCANTARILLA TMC Ø=24"	m	515,60	301,50	155.453,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,60	155.453,40	100,00%
05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES	m2	1.309,85	58,75	76.953,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.309,85	76.953,69	100,00%
05.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2 (MC)	m3	320,94	347,02	111.372,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,94	111.372,60	100,00%
05.04	REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA (e=0.20 m.)	m3	265,73	226,76	60.256,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,73	60.256,93	100,00%
05.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	m2	456,03	5,82	2.654,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456,03	2.654,09	100,00%
05.06	PINTURA EN PARAPETOS	m2	145,80	17,33	2.526,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,80	2.526,71	100,00%
06	ALCANTARILLAS TMC Ø 36"																
06.01	ALCANTARILLA TMC Ø=36"	m	52,40	416,50	21.824,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40	21.824,60	100,00%
06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES	m2	183,20	58,75	10.763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,20	10.763,00	100,00%
06.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2 (MC)	m3	71,90	347,02	24.950,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,90	24.950,74	100,00%
06.04	PINTURA EN PARAPETOS	m2	19,20	17,33	332,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20	332,74	100,00%
07	ALCANTARILLAS TMC Ø 48"																
07.01	ALCANTARILLA TMC Ø=48"	m	56,00	471,50	26.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00	26.404,00	100,00%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISOR
CIP. 84179

057

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES	m2	387,99	58,75	22.794,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,99	22.794,41	100,00%
07.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2 (MC)	m3	99,81	347,02	34.636,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,81	34.636,07	100,00%
07.04	REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA (e=0.20 m.)	m3	146,55	226,76	33.231,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,55	33.231,68	100,00%
07.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	m2	660,15	5,82	3.842,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,15	3.842,07	100,00%
07.06	PINTURA EN PARAPETOS	m2	25,06	17,33	434,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,06	434,29	100,00%
08	BADEN ARMADO																
08.01	BASE PARA BADEN e=0.20m	m3	19,57	48,32	945,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,57	945,62	100,00%
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN ARMADO	m2	102,46	59,52	6.098,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,46	6.098,42	100,00%
08.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	1.448,68	6,84	9.908,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448,68	9.908,97	100,00%
08.04	CONCRETO f'c =245 kg/cm2	m3	25,96	407,85	10.587,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,96	10.587,79	100,00%
08.05	JUNTA ASFALTICA LONGITUDINAL	m	11,00	36,59	402,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	402,49	100,00%
08.06	REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA (e=0.20 m.)	m3	10,94	226,76	2.480,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,94	2.480,75	100,00%
08.07	ENROCADO CON MORTERO	m3	72,00	203,35	14.641,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	14.641,20	100,00%
08.08	LLORADORES PVC Ø 4"	m	47,03	14,92	701,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,03	701,69	100,00%
08.09	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 + 30% P.M.	m3	228,18	276,93	63.189,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,18	63.189,89	100,00%
08.10	RELLENO CON FILTRO	m3	27,22	104,66	2.848,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,22	2.848,85	100,00%
09	MUROS TIPICOS																
09.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 + 30% P.M.	m3	1.978,56	276,93	547.922,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.978,56	547.922,62	100,00%
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	m2	4.084,10	53,32	217.764,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.084,10	217.764,21	100,00%
09.03	JUNTA PARA MUROS TIPICOS	m	113,52	12,92	1.466,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,52	1.466,68	100,00%
09.04	MATERIAL IMPERMEABLE	m3	37,95	185,20	7.028,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,95	7.028,34	100,00%
09.05	GEOTEXTIL	m2	1.517,26	7,69	11.667,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.517,26	11.667,73	100,00%
09.06	DREN PVC Ø 4"	m	506,00	16,17	8.182,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,00	8.182,02	100,00%
09.07	LLORADORES PVC 3 4"	m	446,61	14,65	6.542,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446,61	6.542,84	100,00%
09.08	RELLENO CON FILTRO	m3	455,18	104,66	47.639,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,18	47.639,14	100,00%
09.09	PINTADO DE MUROS Y PARAPETOS	m2	455,40	17,33	7.892,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,40	7.892,08	100,00%
10	CUNETAS SIN REVESTIR																
10.01	CONFORMACIÓN DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO	m	45.192,00	1,10	49.711,20	1.470,00	1.617,00	3,25%	-	-	-	1.470,00	1.617,00	3,25%	43.722,00	48.094,20	96,75%
10.02	CONFORMACIÓN DE CUNETA EN ROCA SUELTA	m	3.240,00	19,85	64.314,00	90,00	1.786,50	2,78%	-	-	-	90,00	1.786,50	2,78%	3.150,00	62.527,50	97,22%
10.03	CONFORMACIÓN DE CUNETA EN ROCA FIJA	m	2.010,00	32,36	65.043,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.010,00	65.043,60	100,00%
11	SEÑALIZACIÓN																
11.01	SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m.	und	82,00	379,26	31.099,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	31.099,32	100,00%
11.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.90m x 0.60 m.	und	2,00	400,48	800,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	800,96	100,00%
11.03	SEÑALES INFORMATIVAS.	m2	17,40	727,34	12.655,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,40	12.655,72	100,00%
11.04	POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO	und	84,00	402,00	33.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,00	33.768,00	100,00%
11.05	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1	und	3,00	2.413,97	7.241,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	7.241,91	100,00%
11.06	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2	und	6,00	1.192,51	7.155,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	7.155,06	100,00%
11.07	POSTES DE KILOMETRAJE	und	33,00	174,90	5.771,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	5.771,70	100,00%
12	IMPACTO AMBIENTAL																
12.01	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	GLB	1,00	3.000,00	3.000,00	0,26	780,00	26,00%	0,13	390,00	13,00%	0,39	1.170,00	39,00%	0,61	1.830,00	61,00%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISOR
CIP. 54174

056

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
12.02	PROGRAMA DE REVEGETACION	GLB	1,00	15.000,00	15.000,00	0,33	4.950,00	33,00%	-	-	-	0,33	4.950,00	33,00%	0,67	10.050,00	67,00%
12.03	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	und	9,00	372,39	3.351,51	3,00	1.117,17	33,33%	-	-	-	3,00	1.117,17	33,33%	6,00	2.234,34	66,67%
13	PROGRAMA DE ABANDONO																
13.01	RESTAURACIÓN DE CANTERAS	m2	5.000,00	2,94	14.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	14.700,00	100,00%
13.02	RESTAURACIÓN DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO	m2	3.000,00	3,53	10.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	10.590,00	100,00%
13.03	RESTAURACIÓN DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS	m2	1.000,00	3,53	3.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.530,00	100,00%
14	VARIOS																
14.01	REPOSICION DE TUBERIA PVC AGUA S.P. CLASE 10 Ø 1"	m	80,00	7,77	621,60	70,00	543,90	87,50%	-	-	-	70,00	543,90	87,50%	10,00	77,70	12,50%
14.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	34,11	58,34	1.989,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,11	1.989,98	100,00%
14.03	FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES	GLB	1,00	139.528,56	139.528,56	0,26	36.277,43	26,00%	0,13	18.138,71	13,00%	0,39	54.416,14	39,00%	0,61	85.112,42	61,00%
15	SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION																
15.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE S	GLB	1,00	3.500,00	3.500,00	1,00	3.500,00	100,00%	-	-	-	1,00	3.500,00	100,00%	-	-	-
15.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1,00	17.549,58	17.549,58	0,50	8.774,79	50,00%	-	-	-	0,50	8.774,79	50,00%	0,50	8.774,79	50,00%
15.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1,00	3.174,50	3.174,50	0,26	825,37	26,00%	0,13	412,69	13,00%	0,39	1.238,06	39,00%	0,61	1.936,45	61,00%
15.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCC	GLB	1,00	2.934,45	2.934,45	0,26	762,96	26,00%	0,13	381,48	13,00%	0,39	1.144,44	39,00%	0,61	1.790,01	61,00%
15.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1,00	3.000,00	3.000,00	0,26	780,00	26,00%	0,13	390,00	13,00%	0,39	1.170,00	39,00%	0,61	1.830,00	61,00%
15.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD	GLB	1,00	1.101,70	1.101,70	0,26	286,44	26,00%	0,13	143,22	13,00%	0,39	429,66	39,00%	0,61	672,04	61,00%
16	PLAN DE VIGILANCIA COVID - 19																
16.01	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19	GLB	1,00	155.000,00	155.000,00	0,26	40.300,00	26,00%	0,13	20.150,00	13,00%	0,39	60.450,00	39,00%	0,61	94.550,00	61,00%
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=13.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25)																
17	OBRAS PROVISIONALES																
17.01	ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA	m3	630,00	9,31	5.865,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	5.865,30	100,00%
18	OBRAS PRELIMINARES																
18.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	149,92	4,01	601,18	-	-	-	149,92	601,18	100,00%	149,92	601,18	100,00%	-	-	-
18.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	214,92	1,65	354,62	-	-	-	214,92	354,62	100,00%	214,92	354,62	100,00%	-	-	-
18.03	BOMBEO PERMANENTE DE AGUA	DIA	20,00	93,42	1.868,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.868,40	100,00%
19	SUB ESTRUCTURAS																
20	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
20.01	EXCAVACIONES BAJO EL N.F.	m3	292,46	12,21	3.570,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,46	3.570,94	100,00%
20.02	EXCAVACION SOBRE EL N.F	m3	162,53	10,24	1.669,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,53	1.669,11	100,00%
20.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES	m2	146,02	3,62	528,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,02	528,59	100,00%
20.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS	m3	184,68	7,24	1.337,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,68	1.337,08	100,00%
20.05	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6"	m3	86,20	167,34	14.424,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,20	14.424,71	100,00%
21	OBRAS DE CONCRETO																
22	ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS																

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84[illegible]

055

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
22.01	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, PARA ZAPATA EN ALETAS	m3	83,39	324,72	27.078,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,39	27.078,40	100,00%
22.02	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS	m3	65,70	347,31	22.818,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,70	22.818,27	100,00%
22.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	8.683,36	6,84	59.394,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.683,36	59.394,18	100,00%
23	PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS																
23.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	209,39	62,20	13.024,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,39	13.024,06	100,00%
23.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	196,95	133,59	26.310,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,95	26.310,55	100,00%
23.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, EN ALETAS	m3	73,43	324,72	23.844,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,43	23.844,19	100,00%
23.04	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS	m3	74,41	335,26	24.946,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,41	24.946,70	100,00%
23.05	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	11.166,98	6,84	76.382,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.166,98	76.382,14	100,00%
24	BARANDAS Y GUARDERAS																
24.01	BARANDAS PARA F°G° 2"	m	54,80	109,72	6.012,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,80	6.012,66	100,00%
24.02	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	m	54,80	17,37	951,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,80	951,88	100,00%
25	VEREDAS																
25.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	15,62	69,85	1.091,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,62	1.091,06	100,00%
25.02	TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS	m2	39,19	35,09	1.375,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,19	1.375,18	100,00%
26	SUPER ESTRUCTURAS																
27	LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA																
27.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	120,08	133,59	16.041,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,08	16.041,49	100,00%
27.02	CONCRETO f'c =280 kg/cm2	m3	29,40	425,90	12.521,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,40	12.521,46	100,00%
27.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	7.318,67	6,84	50.059,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,67	50.059,70	100,00%
27.04	FALSO PUENTE	m2	13,00	201,48	2.619,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	2.619,24	100,00%
28	APOYOS																
28.01	APOYO FIJO	und	2,00	567,94	1.135,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.135,88	100,00%
28.02	APOYO MOVIL	und	2,00	1.517,31	3.034,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.034,62	100,00%
29	VARIOS																
29.01	JUNTAS DE DILATACIÓN e=1"	m	12,20	7,48	91,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	91,26	100,00%
29.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	2,40	56,90	136,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	136,56	100,00%
29.03	TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE	m	32,40	58,37	1.891,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40	1.891,19	100,00%
29.04	SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS	und	2,00	153,80	307,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	307,60	100,00%
29.05	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	GLB	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00	100,00%
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57)																
30	OBRAS PROVISIONALES																
30.01	ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA	m3	880,00	9,31	8.192,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,00	8.192,80	100,00%
31	OBRAS PRELIMINARES																
31.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	171,67	4,01	688,40	-	-	-	171,67	688,40	100,00%	171,67	688,40	100,00%	-	-	-
31.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	246,67	1,65	407,01	-	-	-	246,67	407,01	100,00%	246,67	407,01	100,00%	-	-	-
31.03	BOMBEO PERMANENTE DE AGUA	DIA	20,00	93,42	1.868,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.868,40	100,00%
32	SUB ESTRUCTURAS																
33	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
33.01	EXCAVACIONES BAJO EL N.F.	m3	330,28	12,21	4.032,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,28	4.032,72	100,00%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94534

054

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
33.02	EXCAVACION SOBRE EL N.F	m3	205,84	10,24	2.107,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,84	2.107,80	100,00%
33.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES	m2	164,67	3,62	596,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,67	596,11	100,00%
33.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS	m3	230,85	7,24	1.671,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,85	1.671,35	100,00%
33.05	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6"	m3	98,71	167,34	16.518,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,71	16.518,13	100,00%
34	OBRAS DE CONCRETO																
35	ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS																
35.01	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, PARA ZAPATA EN ALETAS	m3	103,05	324,72	33.462,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,05	33.462,40	100,00%
35.02	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS	m3	65,70	347,31	22.818,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,70	22.818,27	100,00%
35.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	9.944,76	6,84	68.022,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.944,76	68.022,16	100,00%
36	PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS																
36.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	241,60	62,20	15.027,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,60	15.027,52	100,00%
36.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	227,08	133,59	30.335,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,08	30.335,62	100,00%
36.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, EN ALETAS	m3	91,78	324,72	29.802,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,78	29.802,80	100,00%
36.04	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS	m3	75,25	335,26	25.228,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,25	25.228,32	100,00%
36.05	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	12.997,56	6,84	88.903,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.997,56	88.903,31	100,00%
37	BARANDAS Y GUARDERAS																
37.01	BARANDAS PARA F°G° 2"	m	63,20	109,72	6.934,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,20	6.934,30	100,00%
37.02	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	m	63,20	17,37	1.097,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,20	1.097,78	100,00%
38	VEREDAS																
38.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	17,82	69,85	1.244,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,82	1.244,73	100,00%
38.02	TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS	m2	44,71	35,09	1.568,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,71	1.568,87	100,00%
39	SUPER ESTRUCTURAS																
40	LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA																
40.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	145,52	133,59	19.440,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,52	19.440,02	100,00%
40.02	CONCRETO f'c =280 kg/cm2	m3	33,45	425,90	14.246,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,45	14.246,36	100,00%
40.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	8.232,77	6,84	56.312,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.232,77	56.312,15	100,00%
40.04	FALSO PUENTE	m2	15,00	201,48	3.022,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	3.022,20	100,00%
41	APOYOS																
41.01	APOYO FIJO	und	2,00	567,94	1.135,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.135,88	100,00%
41.02	APOYO MOVIL	und	2,00	1.517,31	3.034,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.034,62	100,00%
42	VARIOS																
42.01	JUNTAS DE DILATACIÓN e=1"	m	12,20	7,48	91,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	91,26	100,00%
42.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	3,00	56,90	170,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	170,70	100,00%
42.03	TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE	m	32,40	58,37	1.891,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40	1.891,19	100,00%
42.04	SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS	und	2,00	153,80	307,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	307,60	100,00%
42.05	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	GLB	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00	100,00%
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LAS CHONTAS, L=10.00m (Km 17+574.40 - 17+884.40)																
43	OBRAS PROVISIONALES																
43.01	ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA	m3	360,00	9,31	3.351,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	3.351,60	100,00%
44	OBRAS PRELIMINARES																

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94496

053

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
44.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	145,50	4,01	583,46	-	-	-	145,50	583,46	100,00%	145,50	583,46	100,00%	-	-	-
44.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	195,50	1,65	322,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,50	322,58	100,00%
44.03	BOMBEO PERMANENTE DE AGUA	DIA	20,00	93,42	1.868,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.868,40	100,00%
45	SUB ESTRUCTURAS																
46	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
46.01	EXCAVACIONES BAJO EL N.F.	m3	322,49	12,21	3.937,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,49	3.937,60	100,00%
46.02	EXCAVACION SOBRE EL N.F	m3	202,81	10,24	2.076,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,81	2.076,77	100,00%
46.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES	m2	162,25	3,62	587,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,25	587,35	100,00%
46.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS	m3	176,58	7,24	1.278,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,58	1.278,44	100,00%
46.05	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6"	m3	83,66	167,34	13.999,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,66	13.999,66	100,00%
47	OBRAS DE CONCRETO																
48	ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS																
48.01	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, PARA ZAPATA EN ALETAS	m3	99,74	324,72	32.387,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,74	32.387,57	100,00%
48.02	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS	m3	63,53	347,31	22.064,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,53	22.064,60	100,00%
48.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	7.281,37	6,84	49.804,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.281,37	49.804,57	100,00%
49	PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS																
49.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	195,84	62,20	12.181,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,84	12.181,25	100,00%
49.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	187,92	133,59	25.104,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,92	25.104,23	100,00%
49.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, EN ALETAS	m3	70,05	324,72	22.746,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,05	22.746,64	100,00%
49.04	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS	m3	74,89	335,26	25.107,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,89	25.107,62	100,00%
49.05	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	10.419,13	6,84	71.266,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.419,13	71.266,85	100,00%
50	BARANDAS Y GUARDERAS																
50.01	BARANDAS PARA F°G° 2"	m	44,40	109,72	4.871,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	4.871,57	100,00%
50.02	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	m	44,40	17,37	771,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	771,23	100,00%
51	VEREDAS																
51.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	12,32	69,85	860,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,32	860,55	100,00%
51.02	TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS	m2	30,91	35,09	1.084,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,91	1.084,63	100,00%
52	SUPER ESTRUCTURAS																
53	LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA																
53.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	95,23	133,59	12.721,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,23	12.721,78	100,00%
53.02	CONCRETO f'c =280 kg/cm2	m3	21,47	425,90	9.144,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,47	9.144,07	100,00%
53.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	5.653,63	6,84	38.670,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.653,63	38.670,83	100,00%
53.04	FALSO PUENTE	m2	10,00	201,48	2.014,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	2.014,80	100,00%
54	APOYOS																
54.01	APOYO FIJO	und	2,00	567,94	1.135,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.135,88	100,00%
54.02	APOYO MOVIL	und	2,00	1.517,31	3.034,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.034,62	100,00%
55	VARIOS																
55.01	JUNTAS DE DILATACIÓN e=1"	m	12,20	7,48	91,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	91,26	100,00%
55.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	3,00	56,90	170,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	170,70	100,00%
55.03	TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE	m	32,40	58,37	1.891,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40	1.891,19	100,00%

HECTOR LOZANO SALDAÑA
ING. DE SUPERVISION
CIP. 54174

052

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra: -
Contratista: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S
Residente: ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
Supervisor: ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
Periodo: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Fecha de Inicio de Obra: 01/06/2021
Plazo Contractual: 240 DIAS CALENDARIOS
Termino de Obra Programado: 26/01/2022
Termino de Obra Vigente: 26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
55.04	SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS	und	2,00	153,80	307,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	307,60	100,00%
55.05	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	GLB	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00	100,00%
	PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PORVENIR, L=10.00m (Km 17+813.50 - 17+823.50)																
56	OBRAS PROVISIONALES																
56.01	ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA	m3	460,00	9,31	4.282,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	4.282,60	100,00%
57	OBRAS PRELIMINARES																
57.01	LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	119,82	4,01	480,48	-	-	-	119,82	480,48	100,00%	119,82	480,48	100,00%	-	-	-
57.02	TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS	m2	169,82	1,65	280,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,82	280,20	100,00%
57.03	BOMBEO PERMANENTE DE AGUA	DIA	20,00	93,42	1.868,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.868,40	100,00%
58	SUB ESTRUCTURAS																
59	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
59.01	EXCAVACIONES BAJO EL N.F.	m3	241,88	12,21	2.953,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,88	2.953,35	100,00%
59.02	EXCAVACION SOBRE EL N.F	m3	137,82	10,24	1.411,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,82	1.411,28	100,00%
59.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES	m2	119,84	3,62	433,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,84	433,82	100,00%
59.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS	m3	108,36	7,24	784,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,36	784,53	100,00%
59.05	MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6"	m3	68,90	167,34	11.529,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,90	11.529,73	100,00%
60	OBRAS DE CONCRETO																
61	ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS																
61.01	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, PARA ZAPATA EN ALETAS	m3	55,36	324,72	17.976,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,36	17.976,50	100,00%
61.02	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS	m3	45,25	347,31	15.715,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,25	15.715,78	100,00%
61.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	6.414,92	6,84	43.878,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.414,92	43.878,05	100,00%
62	PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS																
62.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	161,95	62,20	10.073,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,95	10.073,29	100,00%
62.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	150,97	133,59	20.168,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,97	20.168,08	100,00%
62.03	CONCRETO f'c =175 kg/cm2, EN ALETAS	m3	46,98	324,72	15.255,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,98	15.255,35	100,00%
62.04	CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS	m3	54,20	335,26	18.171,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,20	18.171,09	100,00%
62.05	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	7.619,07	6,84	52.114,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.619,07	52.114,44	100,00%
63	BARANDAS Y GUARDERAS																
63.01	BARANDAS PARA F°G° 2"	m	44,40	109,72	4.871,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	4.871,57	100,00%
63.02	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	m	44,40	17,37	771,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	771,23	100,00%
64	VEREDAS																
64.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	12,32	69,85	860,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,32	860,55	100,00%
64.02	TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS	m2	30,91	35,09	1.084,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,91	1.084,63	100,00%
65	SUPER ESTRUCTURAS																
66	LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA																
66.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	95,23	133,59	12.721,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,23	12.721,78	100,00%
66.02	CONCRETO f'c =280 kg/cm2	m3	21,47	425,90	9.144,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,47	9.144,07	100,00%
66.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	kg	5.653,63	6,84	38.670,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.653,63	38.670,83	100,00%
66.04	FALSO PUENTE	m2	10,00	201,48	2.014,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	2.014,80	100,00%
67	APOYOS																

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

051

VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 03 - AGOSTO 2021

Obra:	-		
Contratista:	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA S	*Fecha de Inicio de Obra:*	01/06/2021
Residente:	ING. ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE	*Plazo Contractual:*	240 DIAS CALENDARIOS
Supervisor:	ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA	*Termino de Obra Programado:*	26/01/2022
Periodo:	CONSORCIO SUPERVISOR EDEN	*Termino de Obra Vigente:*	26/01/2022

			REFERENCIAL			ACUMULADO ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
67.01	APOYO FIJO	und	2,00	567,94	1.135,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.135,88	100,00%
67.02	APOYO MOVIL	und	2,00	1.517,31	3.034,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3.034,62	100,00%
68	VARIOS																
68.01	JUNTAS DE DILATACIÓN e=1"	m	12,20	7,48	91,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	91,26	100,00%
68.02	TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	3,00	56,90	170,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	170,70	100,00%
68.03	TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE	m	32,40	58,37	1.891,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40	1.891,19	100,00%
68.04	SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS	und	2,00	153,80	307,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	307,60	100,00%
68.05	LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA	GLB	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000,00	100,00%
	COSTO DIRECTO				7.694.851,50		1.058.768,57			862.117,45			1.920.886,02			5.773.965,48	
	GASTOS GENERALES		10 %		769.485,15		105.876,86			86.211,75			192.088,61			577.396,54	
	UTILIDAD		5 %		384.742,58		52.938,43			43.105,87			96.044,30			288.698,28	
	SUB TOTAL				8.849.079,23		1.217.583,86			991.435,07			2.209.018,93			6.640.060,30	
	IGV.		18 %		1.592.834,26		219.165,09			178.458,31			397.623,40			1.195.210,86	
	PRESUPUESTO TOTAL				**10.441.913,49**		**1.436.748,95**			**1.169.893,38**			**2.606.642,33**			**7.835.271,16**	
	PORCENTAJE VALORIZADO						**13,76%**			**11,20%**			**24,96%**			**75,04%**	

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84134

050

m)CONTROL ECONOMICO DEL OBRA F-04

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84196

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021
E - 4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACIONES

SUSTENTACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS
EJECUCIÓN MENSUAL 2

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"

CONTRATO : N°011-2021-GSRCHOTA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SAN JUAN — PPTO. CONTR. 10.441.913,49

FUENTE FINANCIAMIENTO : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

MESES	VALORIZACIÓN		REAJUSTE DE VALORIZACIONES POR FÓRMULA POLINÓMICA																TOTAL CALENDARIO	A CANCELAR AL CONTRATISTA	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
	Nº	FECHA	P. BASE CONTRATADO	VALORIZ. DEL MES	ESCALAMIENTO			REINTEGRO	DED. DE REINTEGRO QUE NO CORRESP.	DED. DE REINTEGRO QUE NO CORRESP. POR ADEL. MATER.	VALORIZACIÓN BRUTA REAJUSTADA	AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA MATERIALES	VALORIZACIÓN NETA	I.G.V.	ADELANTOS	IGV DEL ADELANTO	V.N. + IGV +ADELANTO	EFECTIVO = (VN - Fg) +	EFECTIVO S/.	EFECTIVO S/.
					MES	K	MONTO															
jun-21	A.D.	11-jun-21														1.327.361,88	238.925,14	1.566.287,02	1.566.287,02	1.566.287,02	0,00
jun-21	01	30-jun-21	8.849.079,23	211.389,89	jun-21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	211.389,89	31.708,48	0,00	179.681,41	32.342,65			212.024,06	212.024,06	0,00	212.024,06
jul-21	02	31-jul-21	8.849.079,23	1.006.193,97	jul-21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.193,97	150.929,09	0,00	855.264,88	153.947,68			1.009.212,56	1.009.212,56	0,00	1.009.212,56
ago-21	A.M.	05-ago-21														1.889.980,69	340.196,52	2.230.177,21	2.230.177,21	2.230.177,21	0,00
ago-21	03	31-ago-21	8.849.079,23	991.435,07	ago-21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	991.435,07	148.715,26	211.750,07	630.969,74	113.574,55			744.544,29	744.544,29	0,00	744.544,29
sep-21	04																				
oct-21	05																				
nov-21	06																				
dic-21	07																				
ene-22	08																				
TOTAL			**8.849.079,23**	**2.209.018,93**			**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.209.018,93**	**331.352,83**	**211.750,07**	**1.665.916,03**	**299.864,89**	**3.217.342,57**	**579.121,66**	**5.762.245,15**	**5.762.245,15**	**3.796.464,23**	**1.965.780,92**
SALDO POR VALOR. PRESUPUESTO BASE CONTRATO				6.640.060,30											1.195.210,85			7.835.271,15			
SALDO POR AMORTIZAR												996.009,05			179.281,63			1.175.290,68			
SALDO MCO. PPTAL 2007																					

PLAZO DE EJECUCIÓN 240 DIAS CALENDARIOS — FECHA DE REINICIO DE OBRA : 01 de junio del 2021 — FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: 26 de enero del 2022

ELABORADO POR CONSORCIO VIAL SAN JUAN — REVISADO POR : — APROBADO POR :

RESIDENTE ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE — JEFE DE PROYECTO : — DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN :

HECTOR LOZANO GALDAMA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84424

048

n)INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94134

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

INFORME MENSUAL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

AGOSTO 2021

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

INFORME Nº 003-2021-CSE/WQA-ESP-ESTRUCTURAS

DE : ING. WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A : ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION

ASUNTO : INFORME MES DE AGOSTO DEL 2021

Referencia : CONTRATATO N°013-2021-GSRCH
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"

Fecha : 03 de septiembre del 2021

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacer llegar el Informe como **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**, dando cumplimiento al contrato firmado con el "CONSORCIO SUPERVISOR EDEN".

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES

La Gerencia Sub Regional Chota, encarga al Consorcio SAN JOSE, mediante Contrato Nº 101-2014-GSRCHOTA, de fecha 02 de octubre de 2014, la ejecución del Estudio Definitivo para el MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN – PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN – CAJAMARCA.

La Carretera Cruce Santa Rosa hasta Cruce Oxapampa, se encuentra como uno de los proyectos prioritarios para El Gobierno Regional de Cajamarca, por lo que es de interés del Gobierno Sub Regional Chota y Gobiernos Locales del área de influencia.

Con CARTA Nº010-2021/CONS.VIAL.SAN JUAN de fecha 28/06/2021, la contratista entrega el informe de revisión técnico, donde indica que no se encuentran los planos de planta y perfil d ellos 04 puentes considerados en el Expediente Técnico.

Con CARTA Nº011-2021/RRV/RL/CSE de fecha 23/07/2021, el sr. Roymer Rivera Vásquez (Representante Común) del CONSORCIO SUPERVISOR EDEN, solicita a la entidad los planos de planta y perfil de los 04 puentes del proyecto, de acuerdo a INFORME Nº010-2021-HLS/JS del supervisor de obra.

Con CARTA Nº626-2021-GR-CAJ-GSRCH/G de fecha 20/08/2021, el Ing. MARTIN VASQUEZ RUBIO (Gerente Subregional), hace llegar a la supervisión los planos de planta y perfil de los puentes 01 y 02.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

Con CARTA N° 001 – 2021/RRV/RL/CSE de fecha 20/08/2021, el sr. ROYMER RIVERA VASQUEZ (Representante Común) del CONSORCIO SUPERVISOR EDEN, hace llegar a la contratista los planos de planta y perfil entregados por la entidad, para continuar con la ejecución el proyecto.

1.2 METAS

Teniendo en cuenta el monto máximo de Inversión establecido en el documento de Declaratoria de Viabilidad, los lineamientos del perfil aprobado y la normatividad vigente, se han propuesto las metas para efectos de "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN – PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN – CAJAMARCA", según el siguiente detalle:

1.- 32.74km de carretera mejorada a nivel de afirmado (e=0.28m), con un ancho de calzada de 4.50m, con bermas laterales de 0.50m, bombeo de 2.5%, peraltes, plazoletas de cruce cada 500m
2.- 50.62km de cunetas de 0.30 * 0.50m..
3.-Construcción de 04 puentes de concreto armado, aletas de f'c=175kg/cm2, Estribos de C° f'c=210 Kg/cm2 y superestructura f'c=280 Kg/cm2
4.- Construcción de 01 baden de C° armado f'c=245Kg/cm2, con muro de sostenimiento.
5.- Construcción de 09 alcantarilla tipo TMC Ø 48"
6.- Construcción de 08 alcantarillas tipo TMC Ø 36"
7.- Construcción de 81 alcantarillas de TMC Ø 24"
8.- Construcción de muros de sostenimiento de concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 .
9.- Reposicion de pases de agua
10.- Mitigación de impacto ambiental
11.- Obras de señalización

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

2. DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO

a. Denominación de la obra:
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN – PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN – CAJAMARCA.

b. Ubicación:

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: HUALGAYOC Y CELENDIN
DISTRITO	: BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN

c.	**Contratista de ejecución**	:	CONSORCIO VIAL SAN JUAN
d.	**Ingeniero Residente**	:	Ing. Roberto Carlos Tinoco Zarate
e.	**Supervisión**	:	CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
f.	**Ing. Jefe de Supervisión**	:	Ing. Héctor Lozano Saldaña
g.	**Monto referencial Obra**	:	S/. 11'602,126.10
h.	**Monto contractual**	:	S/. 10'441,913.49
i.	**Sistema de Contratación**	:	Precios Unitarios
j.	**Fecha de entrega de terreno**	:	22 de abril del 2021
k.	**Fecha inicio de obra**	:	01 de Junio del 2021
l.	**Plazo ejecución Contractual**	:	240 días calendarios
m.	**Fecha termino contractual**	:	26 de Enero del 2022

3. ACTIVIDADES SUCITADAS EN EL MES DE AGOSTO:

A la fecha la obra en general se encuentra a nivel de trazo y replanteo a lo largo de esta, así mismo movimiento de tierras (corte en material suelto, corte roca suelta), conformación de cunetas, perfilado y compactado de subrasante.

Con respecto a las obras de arte y estructuras en todo el proyecto, estas se encuentran de la siguiente manera:

- Alcantarillas de Ø=24": a nivel de Replanteo Topográfico
- Alcantarillas de Ø=36": a nivel de Replanteo Topográfico
- Alcantarillas de Ø=48": a nivel de Replanteo Topográfico
- Baden Armado: a nivel de Replanteo Topográfico.
- Muros Típicos: a nivel de Replanteo Topográfico.

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

- **PUENTES**

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION

- **PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=43.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25),** se han ejecutado las siguientes partidas:

LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL DE ACCESOS Y ESTRIBOS DE PUENTE

Descripción

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está

referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

TRAZO Y REPLANTEO

Descripción

Comprende el replanteo del eje del puente, el trazo para las excavaciones en accesos y el establecimiento de las cotas o niveles de referencia para los elementos de la estructura.

- **PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57),** se han ejecutado las siguientes partidas:

LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL DE ACCESOS Y ESTRIBOS DE PUENTE

Descripción

Tanto el área de accesos, aletas y estribos serán limpiados, cortando y eliminando los arbustos para poder realizar el trazo del puente. La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, de la carretera antigua que servirá de variante para el tránsito vehicular durante la construcción del puente, hasta su puesta en servicio.

TRAZO Y REPLANTEO

Descripción

Comprende el replanteo del eje del puente, el trazo para las excavaciones en accesos y el establecimiento de las cotas o niveles de referencia para los elementos de la estructura.

- **PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LAS CHONTAS, L=10.00m (Km 17+574.40 - 17+584.40)**, a nivel de Replanteo Topográfico.

- **PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PORVENIR, L=10.00m (Km 17+813.50 - 17+823.50)**: a nivel de Replanteo Topográfico.

4. CONCLUSIONES

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 94176

- Realizadas las visitas a campo se verificó que el contratista durante el mes de agosto ha iniciado con la ejecución de los puentes 01 y 02 del proyecto, de la misma manera la ejecución se ha visto retrasada con respecto a su calendario programado, ya que los planos de planta y perfil de estos puentes han sido entregados por parte de la entidad el día 20 de agosto del presente.

- Se continua con la identificación de la ubicación de estructuras de obras de arte en campo de acuerdo al replanteo topográfico que viene realizando el contratista, asimismo lo plasmado en el expediente técnico.

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

- Se continua con el reconocimiento de terreno en las áreas donde están proyectadas las estructuras en obra según el replanteo topográfico que viene realizando el contratista, asimismo lo plasmado en el expediente técnico

- Se vienen supervisando y coordinando con el contratista sobre los trabajos correspondientes al área de estructuras, para no tener algunas discrepancias durante proceso constructivo de estos.

- De presentarse algún replanteo o modificación en la especialidad de Estructuras en los próximos días de trabajo conforme avance el proyecto, se harán llegar las recomendaciones sustentadas técnicamente.

5. RECOMENDACIONES:

- Realizar las coordinaciones con la supervisión, para que las consultas de obra en la especialidad de estructuras se realicen en forma oportuna sobre las incompatibilidades presentadas en el Expediente Técnico.
- Realizar la ejecución de las partidas correspondientes a la especialidad de estructuras de acuerdo al cronograma de obra presentado por la contratista.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61713

6. **PANEL TOPOGRAFICO:**

FOTOGRAFIA Nº01: PRESENCIA DEL AREA TECNICA DE LA ENTIDAD CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION, EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=13.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25).

FOTOGRAFIA Nº02: PRESENCIA DEL AREA TECNICA DE LA ENTIDAD CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION, EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57)

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

FOTOGRAFIA Nº03: TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LAS CHONTAS, L=10.00m (Km 17+574.40 - 17+584.40).

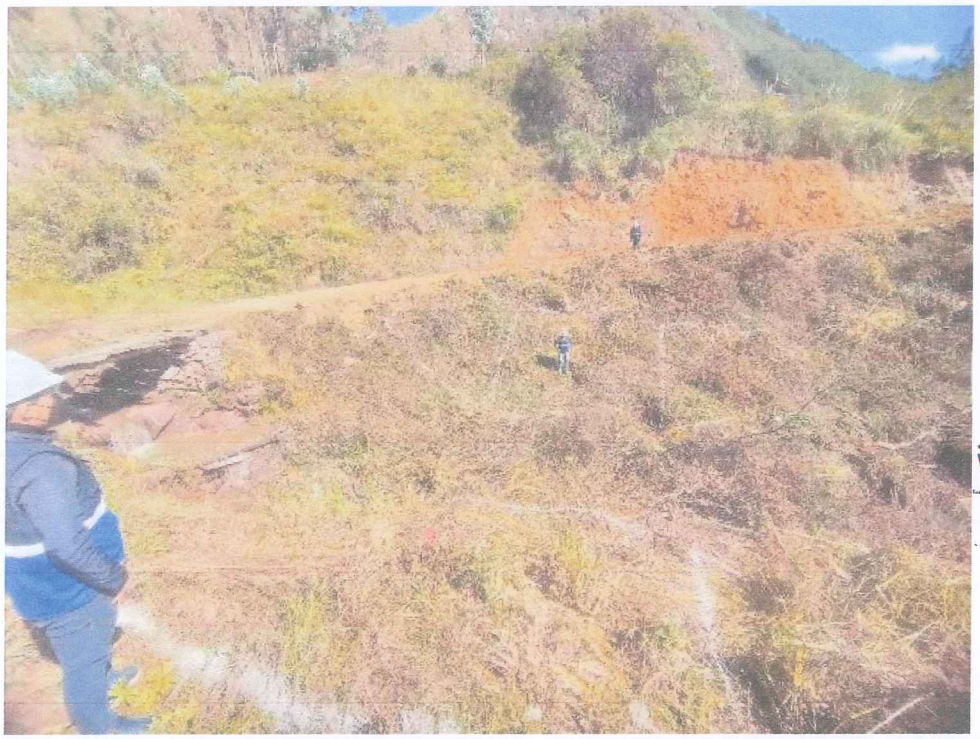

FOTOGRAFIA Nº04: VERIFICACION DEL TRAZO REPLANTEADO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO LANCHE, L=13.00m (Km 11+914.25 - 11+927.25).

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61718

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

FOTOGRAFIA Nº05: VERIFICACION DEL TRAZO REPLANTEADO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO BALSILLAS, L=15.00m (Km 15+086.57 - 15+101.57).

WILMER QUISPE ACOSTA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP. 61715

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

INFORME MENSUAL

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

AGOSTO 2021

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

RAMIRO KOBI CORONEL CAJINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. 138617

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

INFORME N° 04 – 2021-RKC/ PREVENCIONISTA DE SUPERVISIÓN

DE:	**Ing. Ramiro Kobi Coronel** **Prevencionista de Obra.**
A:	**Ing. Héctor Lozano Saldaña** **Jefe Supervisión de Obra.**
ASUNTO:	**INFORME MES DE AGOSTO DEL 2021**
OBRA:	**"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"**
FECHA:	**03 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacer llegar el Informe individual como **PREVENCIONISTA**, dando cumplimiento al contrato firmado con el "CONSORCIO SUPERVISOR EDEN", correspondiente al mes de agosto del 2021:

1. FICHA TÉCNICA

a. Denominación de la obra:

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDÍN - CAJAMARCA"

b. Ubicación:

Región	:	Cajamarca
Provincia	:	Hualgayoc y Celendín
Distrito	:	Bambamarca y la Libertad de Pallán

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94174

RAMIRO KOBI CORONEL CAJINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. 138017

c. Metas:

Según lo indicado en el expediente técnico, las metas del proyecto consisten en el mejoramiento total a nivel de afirmado y la implementación de obras de arte (badenes, alcantarillas, puentes y cunetas). A continuación, se describen las metas físicas:

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

1.- 32.74km de carretera mejorada a nivel de afirmado (e=0.28m), con un ancho de calzada de 4.50m, con bermas laterales de 0.50m, bombeo de 2.5% , peraltes, plazoletas de cruce cada 500m
2.- 50.62km de cunetas de 0.30 * 0.50m..
3.-Construcción de 04 puentes de concreto armado, aletas de f'c=175kg/cm2, Estribos de C° f'c=210 Kg/cm2 y superestructura f'c=280 Kg/cm2
4.- Construcción de 01 baden de C° armado f'c=245Kg/cm2, con muro de sostenimiento.
5.- Construcción de 09 alcantarilla tipo TMC Ø 48"
6.- Construcción de 08 alcantarillas tipo TMC Ø 36"
7.- Construcción de 81 alcantarillas de TMC Ø 24"
8.- Construcción de muros de sostenimiento de concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 .
9.- Reposicion de pases de agua
10.- Mitigación de impacto ambiental
11.- Obras de señalización

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

d. Contratista de ejecución : CONSORCIO VIAL SAL JUAN
e. Ingeniero Residente : ROBERTO CARLOS TINOCO ZARATE
f. Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
g. Ing. jefe de Supervisión : HECTOR LOZANO SALDAÑA
h. Monto referencial Obra : S/. 11'602,126.10
i. Monto contractual : S/. 10'441,913.49
j. Sistema de contratación : Precios unitarios
k. Fecha inicio de obra : 01 de junio del 2021
l. Plazo ejecución Contractual : 240 días calendarios
m. Fecha termino contractual : 26 de enero del 2022

RAMIRO KOBI CORONEL CAJINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. [illegible]

2. ANTECEDENTES

- Con fecha 31 de marzo del 2021, se adjudica la BUENA PRO AL CONSORCIO EDEN.
- Con fecha 22 de abril del 2021, se suscribe el acta de entrega de terreno para ejecución de obra.
- Con **Carta N.º 011–2021/CONS.VIAL.SAN.JUAN**, de fecha 28 de junio del 2021, el Consorcio Vial San Juan, hace entrega a la supervisión el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Con **CARTA N°010 – 2021/RRV/RL/CSE,** de fecha 09 de julio del 2021, el Consorcio Supervisor Eden, hace entrega a la entidad el plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista.
- Con **CARTA N°616 – 2021-GR-CAJ-GSRCH/G,** de fecha 23 de julio del 2021, la entidad (Gerencia Sub Regional Chota), hace entrega de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista.
- Con fecha 03 de agosto del 2021 se adjunta el **INFORME N°03 – 2021-RKC/ PREVENCIONISTA DE SUPERVISIÓN** a la VALORIZACIÓN N°02 – MES DE JULIO 2021 DE LA SUPERVISIÓN.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PREVENCIONISTA DE SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

- Verificar que se ha inspeccionado todo el equipo antes de realizar las labores.
- Comprobar que se han realizados las inspecciones adecuadas a los equipos de seguridad y medios auxiliares antes de su uso.
- Comprobar que el equipo de protección personal y colectiva sea idóneo para su uso propuesto.
- Preparar e implantar un programa de formación y motivación.
- Participar en la misión de permisos de trabajo estableciendo las medidas de seguridad junto con el Ing. Supervisor con el fin de garantizar buenas relaciones laborales seguras para todos los trabajadores.
- Registrar los actos y condiciones seguras que se hayan observado en el sistema de la obra.
- Corregir actos y comportamientos subestándares; y así generar culturas preventivas.
- Promover las buenas prácticas medio ambientales y garantizar que se esté efectuando una gestión adecuada de los residuos.

RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. 324581

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

- Dar el ejemplo de su compromiso de fiel cumplimiento en seguridad, salud y medio ambiente, cumpliendo con el plan de prevención y control del COVID-19.
- Realizar las charlas de 10 minutos en coordinación con los Ingenieros de obra.
- Verificar cuando la maquinaria se encuentre parqueada, a su costado se encuentren los conos de seguridad.

4. CONCLUSIONES

- Los índices de seguridad del mes de agosto son:

  . El Índice de Frecuencia es 0.00 y el Acumulado del proyecto es 0.00

  . El Índice de Severidad es 0.00 y el Acumulado del proyecto es 0.00

  . El Índice de Accidentabilidad es 0.00 y el Acumulado del proyecto es 0.00

- Incidencia en los hallazgos en condiciones subestándar encontrados en obra, las cuales, la SUPERVISIÓN está corrigiendo en su momento.

- El contratista mantiene conformado su comité de seguridad, según la ley N°29783, tal cual lo especificó en su informe respectivo del contratista.

- El contratista continúa con la implementación adecuada de herramientas de gestión en seguridad de acuerdo al plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado.

- Si se encuentran presenten las señalizaciones temporales de advertencia y obligación en los frentes de trabajo.

- En merito a lo expuesto se concluye que como **Prevencionista de Supervisión** he cumplido con las actividades de acuerdo al contrato suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR EDEN, en el periodo agosto del 2021.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. [illegible]

5. PANEL FOTOGRÁFICO

Fig. n° 1: Realización del plan COVID-19 y seguridad por parte de la supervisión.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. 125417

Fig. n° 02: Medición de la temperatura al plantel profesional de la SUPERVISIÓN EDEN.

Foto n° 3: Verificación de maquinaria realizando sus actividades diarias.

Foto n° 4: Plantel profesional y obreros realizando sus actividades con sus respectivos EPI.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. [illegible]

Foto n° 5: Acomodación y conformación de DME.

Foto n° 6: Previa verificación de perforación de roca fija para voladura.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO EN SEGURIDAD
CIP. [illegible]

029

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÙ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA"

INFORME MENSUAL
ASISTENTE DE SUPERVISION
AGOSTO 2021

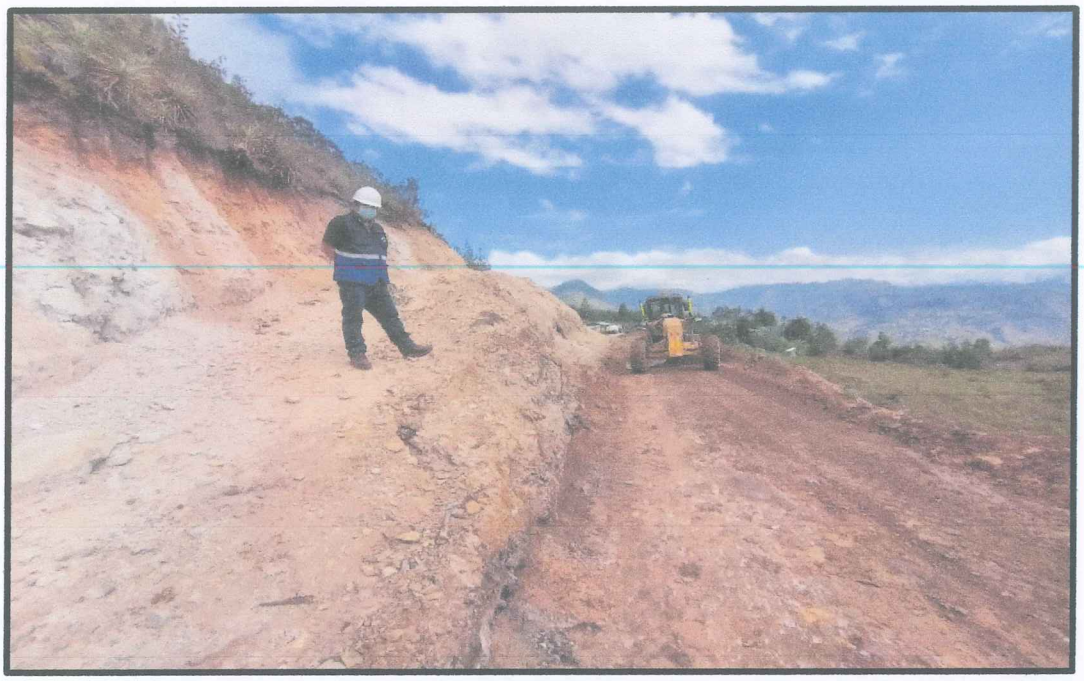

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

HENRI CALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

INFORME Nº 003-2021-CSE/HJAB-ING-ASISTENTE

DE : ING.HENRI J. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION

A : ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION

ASUNTO : INFORME DEL MES DE AGOSTO 2021.

REFERENCIA : CONTRATO Nº013-2021-GSRCH, CONSULTORIA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN – PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN"

FECHA : 03 DE SETIEMBRE DEL 2021

Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer llegar el informe como ASISTENTE DE SUPERVISION, dando cumplimiento al contrato firmado con el "CONSORCIO SUPERVISOR EDEN".

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 ANTECEDENTES.

La Gerencia Sub Regional Chota, encarga al CONSORCIO SAN JOSE, mediante contrato Nº101-2014-gsrch, de fecha 02 de octubre de 2014, la ejecución del estudio definitivo para el "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN- PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN – CAJAMARCA".

La carretera cruce Santa Rosa hasta cruce Oxapampa, se encuentra como uno de los proyectos prioritarios para el gobierno regional de Cajamarca, por lo que es de interés del gobierno sub regional chota y gobiernos locales del área de influencia.

1.2 METAS

TENIENDO EN CUENTA EL MONTO MAXIMO DE INVERSION ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD, LOS LINEAMIENTOS DEL PERFIL APROBADO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE, se han propuesto las metas para efectos de "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN- PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN – CAJAMARCA", según el siguiente detalle:

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

HENRI J. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

1.- 32.74km de carretera mejorada a nivel de afirmado (e=0.28m), con un ancho de calzada de 4.50m, con bermas laterales de 0.50m, bombeo de 2.5%, peraltes, plazoletas de cruce cada 500m.
2.-50.62km de cunetas de 0.30 * 0.50m
3.- Construcción de 04 puentes de concreto armado, aletas de f´c=175kg/cm2, estribos de Cº f´c=210kg/cm2 y Super-Estructura f´c=280kg/cm2.
4.-Construcción de 01 baden de Cº armado f´c=245 kg/cm2, con muro de sostenimiento.
5.- Construcción de 09 alcantarillas tipo TMC Ø 48"
6.- Construcción de 08 alcantarillas tipo TMC Ø 36"
7.- Construcción de 81 alcantarillas de TMC Ø 24"
8.- Construcción de muros de sostenimiento de Cº ciclopeo f´c=175kg/cm2
9.- Reposición de pases de agua
10.- Mitigación de impacto ambiental
11.- Obras de señalización

2. **DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO.**
   a. **Denominación de la obra:**
   MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN-PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN-CAJAMARCA.
   b. **Ubicación:**

	DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
	PROVINCIA	: HUALGAYOC Y CELENDIN
	DISTRITO	: BAMBAMARCA Y LA LIBERTA DE PALLAN
c.	Contratista de ejecución	: CONSORCIO VIAL SAN JUAN
d.	Ingeniero Residente	: Ing. Roberto Carlos Tinoco Zarate
e.	Supervisión	: CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
f.	Ing. jefe de supervisión	: Ing. Héctor Lozano Saldaña
g.	Monto referencial de la obra	: S/.11´602,126.10
h.	Monto Contractual	: S/.10´441,913.49
i.	Sistema de Contratación	: Precios Unitarios
j.	Fecha de entrega de Terreno	: 22 de abril del 2021
k.	Fecha de Inicio de Obra	: 01 de junio del 2021
l.	Plazo de Ejecución Contractual	: 240 días calendarios
m.	Fecha de Término Contractual	:26 de enero del 2022.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54176

HENRY ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

3. **ACTIVIDADES REALIZADAS COMO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO:**

las actividades realizadas como asistente de supervisión son como se detalla:

- ✓ En la movilización de equipo y maquinaria.
- ✓ En el trazo y replanteo topográfico.
- ✓ En la implementación y ejecución del plan para la vigilancia, prevención y control de la covid-19.
- ✓ En las charlas de capacitación de seguridad.
- ✓ En la ejecución del programa de educación ambiental.
- ✓ En la ejecución del programa de señalización ambiental.
- ✓ En la verificación de la correcta utilización de EPP´S en obra.
- ✓ En el tramite de documentos emitidos a la entidad y a la contratista.
- ✓ En la ejecución de la partida de corte en material suelto y roca suelta.
- ✓ En la ejecución de la partida de conformación de cunetas.
- ✓ En la absolución de las consultas planteadas por la contratista.
- ✓ En la verificación de los metrados ejecutados para la conciliación de los mismos.
- ✓ En la verificación de ubicación, diámetro y longitud de alcantarillas de Ø 24",36" y 48".
- ✓ En la verificación del posicionamiento de 04 puentes de concreto armado.
- ✓ En la verificación de posicionamiento de baden y muros de sostenimiento.
- ✓ Elaboración de la valorización mensual de la supervisión del mes de Agosto.

4. **CONCLUSIONES.**

- En merito a lo expuesto se concluye como **ASISTENTE DE SUPERVISION** he cumplido con las actividades de acuerdo al contrato suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR EDEN, en el periodo de agosto del 2021.

5. **RECOMENDACIONES.**

- Realizar las coordinaciones correspondientes de forma oportuna para solucionar los inconvenientes que se podrían presentar durante la ejecución de la obra.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

HENRI J. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

6. **PANEL FOTOGRAFICO**

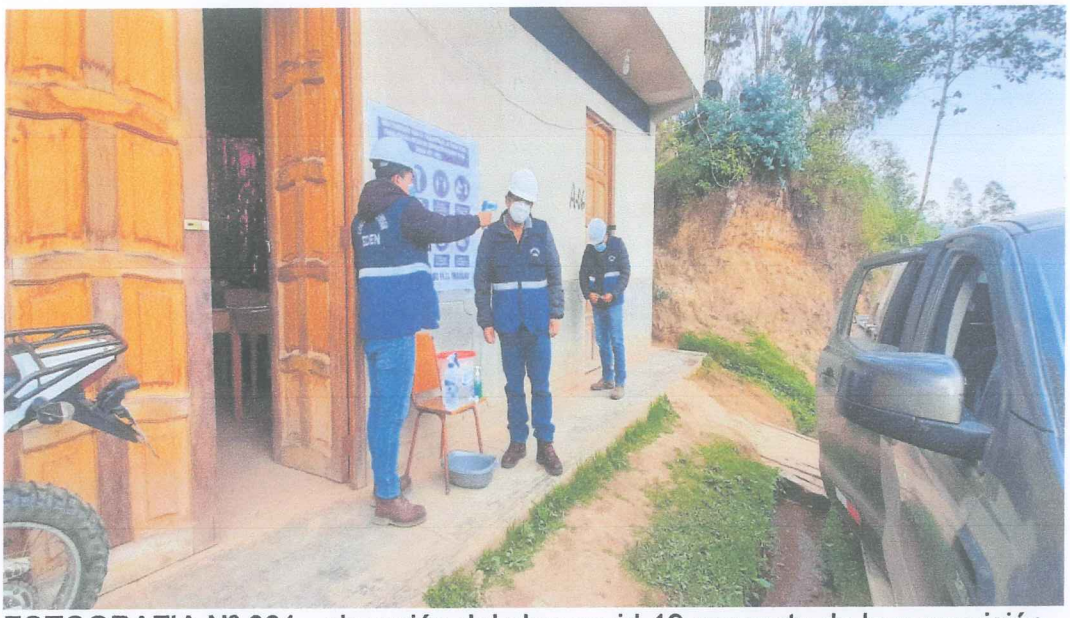

FOTOGRAFIA Nº 001.- ejecución del plan covid-19 por parte de la supervisión.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFIA Nº 002.- ejecución del plan de covid-19 por parte de la supervisión.

HENRI J. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

FOTOGRAFIA Nº 003.- reunión con la residencia para coordinaciones de obra.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54124

FOTOGRAFIA Nº004.- verificación de ancho de vía.

HENRY ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

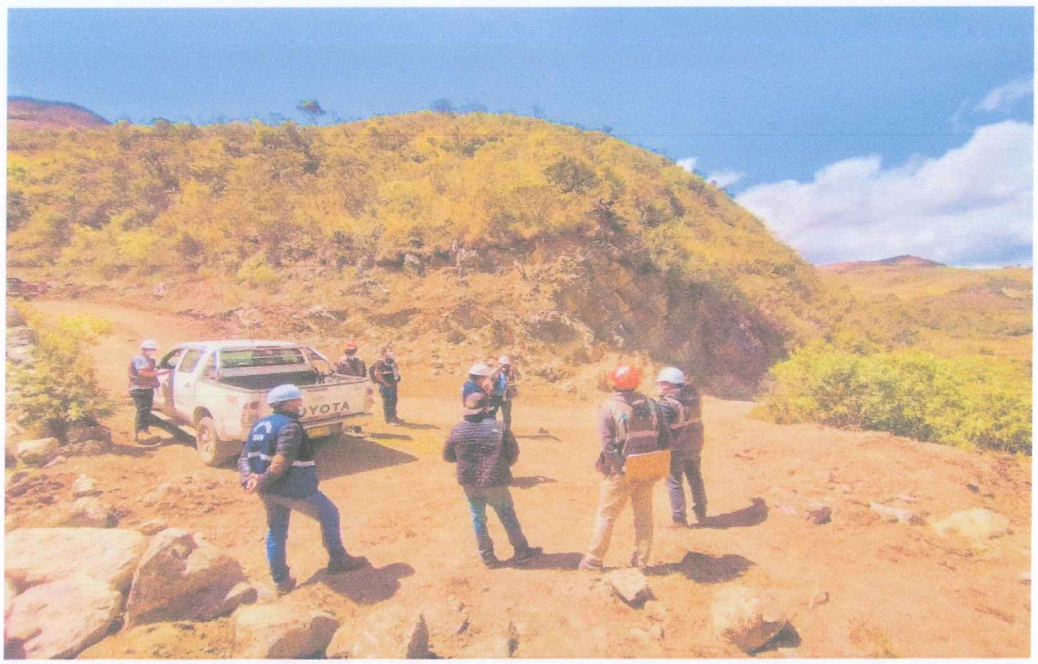

FOTOGRAFIA Nº 005.- Coordinaciones con pobladores, durante la ejecución de la obra.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

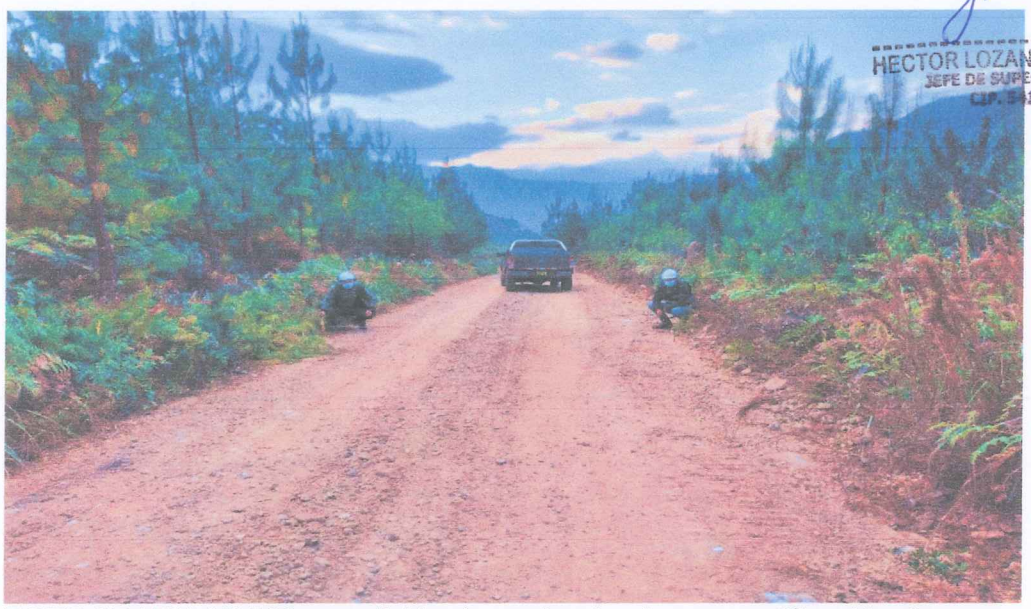

FOTOGRAFIA Nº 006.- medición de ancho de vía para verificación de compatibilidad de expediente técnico y terreno.

HENRY V. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

FOTOGRAFIA Nº 007.- Alineamiento de eje en puentes.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

FOTOGRAFIA Nº 008.- verificación de apertura de vía en variante.

HENRY J. ALARCON BARAHONA
ASISTENTE DE SUPERVISION
CIP. 225322
CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

o)COPIA DE R.H. FACTURAS DE LOS PROFESIONALES

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94494

020

LOZANO SALDAÑA HECTOR

INGENIERO

CAL. PROCERES NRO. 745 URB. LATINA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

TELÉFONO: 256671

R.U.C. 10273739268

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-108

Recibí de CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Identificado con RUC **Número** 20607832898

Domiciliado en JR. DIEGO VILLACORTA NRO. 396 CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA

La suma de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE SUPERVISION EN LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIAS DE HULAGAYOC Y CELENDIN-CAJAMARCA

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 **de** Setiembre **del** 2021

Total por Honorarios	:	9,000.00
Retención (8 %) IR	:	(720.00)
Total Neto Recibido	:	8,280.00 SOLES

Descargar en Formato Digital Seguro *Descargar en Formato PDF* *Imprimir*

e-mail Registrar Pagos Enviar

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94696

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

p)CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 24179

015

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0352875

3 541740 314189

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): LOZANO SALDAÑA HECTOR

Adscrito al Consejo Departamental de: LAMBAYEQUE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 54174 Fecha de Incorporación: 27/08/1997

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	SERVICIOS PROFESIONALES
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

Chiclayo, 17 de Mayo del 2021

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL LAMBAYEQUE

Ing. CIP Walter Zamora Capelli
DECANO DEPARTAMENTAL
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 34174

013

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0351502

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): CORONEL CAMINO RAMIRO KOBI

Adscrito al Consejo Departamental de: LAMBAYEQUE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 135617 Fecha de Incorporación: 29/05/2012

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	SERVICIOS PROFESIONALES
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
30	09	2021

Chiclayo, 31 de Marzo del 2021

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL LAMBAYEQUE

Ing. CIP Walter Zamora Capelli
DECANO DEPARTAMENTAL
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

q)ANEXOS

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94176

q.1)CONTRATO

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84139

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CONTRATO Nº 013 -2021-GSRCHOTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 026-2020-GSRCHOTA TERCERA CONVOCATORIA
SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN CAJAMARCA"**, que celebran de una parte la **GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA** con Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 20368999726, con domicilio legal en el Jr. Sagrado Corazón de Jesús Nº 620-Chota, Representado por su Gerente el **ING. VICTOR ANTONIO CENTA CUEVA**, Identificado con DNI N°-17937741, Gerente Sub Regional, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº-D000063-2021-GRC-GR, a quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD;** y, de otra parte el **"CONSORCIO SUPERVISOR EDEN", con Ruc 20607832898**, y el Señor: **ROYMER RIVERA VASQUEZ,** identificado con DNI Nº 70833943, **quien es el representante común** del consorcio, con domicilio legal en el Jr. Diego Villacorta Nº 396-Chota-Cajamarca debidamente conformado por 02 consorciados: **1.- "NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ"**, identificado con DNI Nº 40667523, con **RUC Nº 10406675233**, con domicilio legal en el Pasaje Antonio Soto Burga Nº 147- Chota, con una participación del **40%**; y **2: "VENTURA CARRILLO JOHNNY ALAN"**, identificado con DNI Nº 42311209, con **RUC Nº 10423112099**, con domicilio legal en la calle los Alisos Mz K1 Lt. 14, Villa Hermosa José Leonardo Ortiz-Chiclayo-Lambayeque, con una participación del **60%;** a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07 de Abril del 2021, el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 026-2020-GSRCH – Tercera convocatoria**, para la contratación de la supervisión de la obra "Mejoramiento Del Camino Vecinal Tramo Cruce Santa Rosa Hasta Cruce Oxapampa, Distritos De Bambamarca Y La Liberta De Pallan – Provincias De Hualgayoc Y Celendín – Cajamarca", al "**CONSORCIO SUPERVISOR EDEN**", cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento Del Camino Vecinal Tramo Cruce Santa Rosa Hasta Cruce Oxapampa, Distritos De Bambamarca Y La Liberta De Pallan – Provincias De Hualgayoc Y Celendín – Cajamarca".

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84474

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 354,667.59** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 59/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA bajo el SISTEMA DE TARIFAS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **270 días calendarios**, de los cuales **240 días** son para la supervisión de obra y **30 días** para la liquidación en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora[2], así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

---

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

[2] La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54174

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la CARTA Nº 002-2021-CSE/RC, solicitando la retención del 10% como garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato por el monto de: **S/ 35,466.76, (TREINTAICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100 SOLES),** a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad final de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) días de firmado el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia Sub Regional.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Yomer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 54134

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94176

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Nº	PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del	0.50 U.I.T. por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

	Reglamento.		
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.50 de U.I.T por cada día de ausencia del personal.	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
3	Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.	3% del monto del contrato de supervisión	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
4	Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad.	0.05 de U.I.T por cada día de evento	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
5	Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe partidas no ejecutas o apruebe avances físicos sobredimensionados. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.	0.10 de U.I.T por cada valorización	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
6	Cuando el supervisor autorice o apruebe la ejecución de partidas adicionales de obra sin la debida autorización de la Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la entidad	0.80 de U.I.T por cada Adicional	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
7	Cuando el Supervisor presente en forma extemporánea los informes de avance de obra, de conformidad del expediente Técnico, liquidación de obra, dentro del	0.20 de U.I.T por tramite Extemporáneo o fuera de	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HEDER LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84174

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

	plazo establecido en las bases, la Ley y el Reglamento. La multa es por cada día de retraso.	fecha	obra.
8	Cuando la Supervisión tramita la valorización de avance de obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso), adicionales, (de ser el caso) y otros con documentación sustentatoria faltante que perjudique su trámite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar a la Supervisión por dicha demora, la multa es por cada documento faltante.	0.20 de U.I.T por tramite incompleto	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
9	Cuando No presenta los informes especiales dentro del plazo requeridos por la entidad.	0.3 UIT Por cada día de atraso.	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
10	Cuando el supervisor de la obra realice asientos en el cuaderno de obra digital en la calificación que no corresponda se penalizara (por ejemplo, realiza asiento de ampliación de plazo en otras ocurrencias). Los tipos de asiento están detallados en Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.	0.10 UIT por cada ocurrencia	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
11	Cuando el supervisor de la obra se pronuncia favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales, sin advertir errores en el cálculo del monto solicitado	0.20 UIT por cada ocurrencia	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.
12	Cuando el supervisor de la obra no aplica la Tabla de Penalidad para el Contratista de Obra, pese a tener conocimiento de las infracciones.	0.20 UIT por cada ocurrencia	Según Informe de la Sub Gerencia Operaciones y/o coordinador de obra.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 84124

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO BALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 84174

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[3]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD Jr. Sagrado Corazón de Jesús Nº- 620- Chota,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Diego Villacorta Nº 396-Chota-Cajamarca.
CORREO : consorcioeden_20@hotmail.com

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

---

3. De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN
Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN

HECTOR LOZANO BALDAÑA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. 94174

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chota, a los Seis días del mes de Mayo del 2021.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Ing. Víctor A. Centa Cueva
(e) GERENTA SUB REGIONAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR EDEN

Roymer Rivera Vásquez
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

HECTOR LOZANO SALDAÑA
JEFE DE SUPERVISION
CIP. 94174
